

Bezirksversammlung Bergedorf

Fachausschusses für Verkehr und Inneres

Ersatzneubau Brücke B5 über die AKN-Gleise

14.11.2022



LSBG
Landesbetrieb Straßen,
Brücken und Gewässer
Hamburg



Hamburg

Terminübersicht

Vertragliche Fertigstellung:

Ende Januar 2023

Aktueller Fertigstellungstermin:

Ende November 2023


Sperrung B5 und Gleise (Einhub „VFT“-Träger):

02. – 05.12.2022

Wechsel zum 2. Bauabschnitt:

März / April 2023

Aktueller Baufortschritt

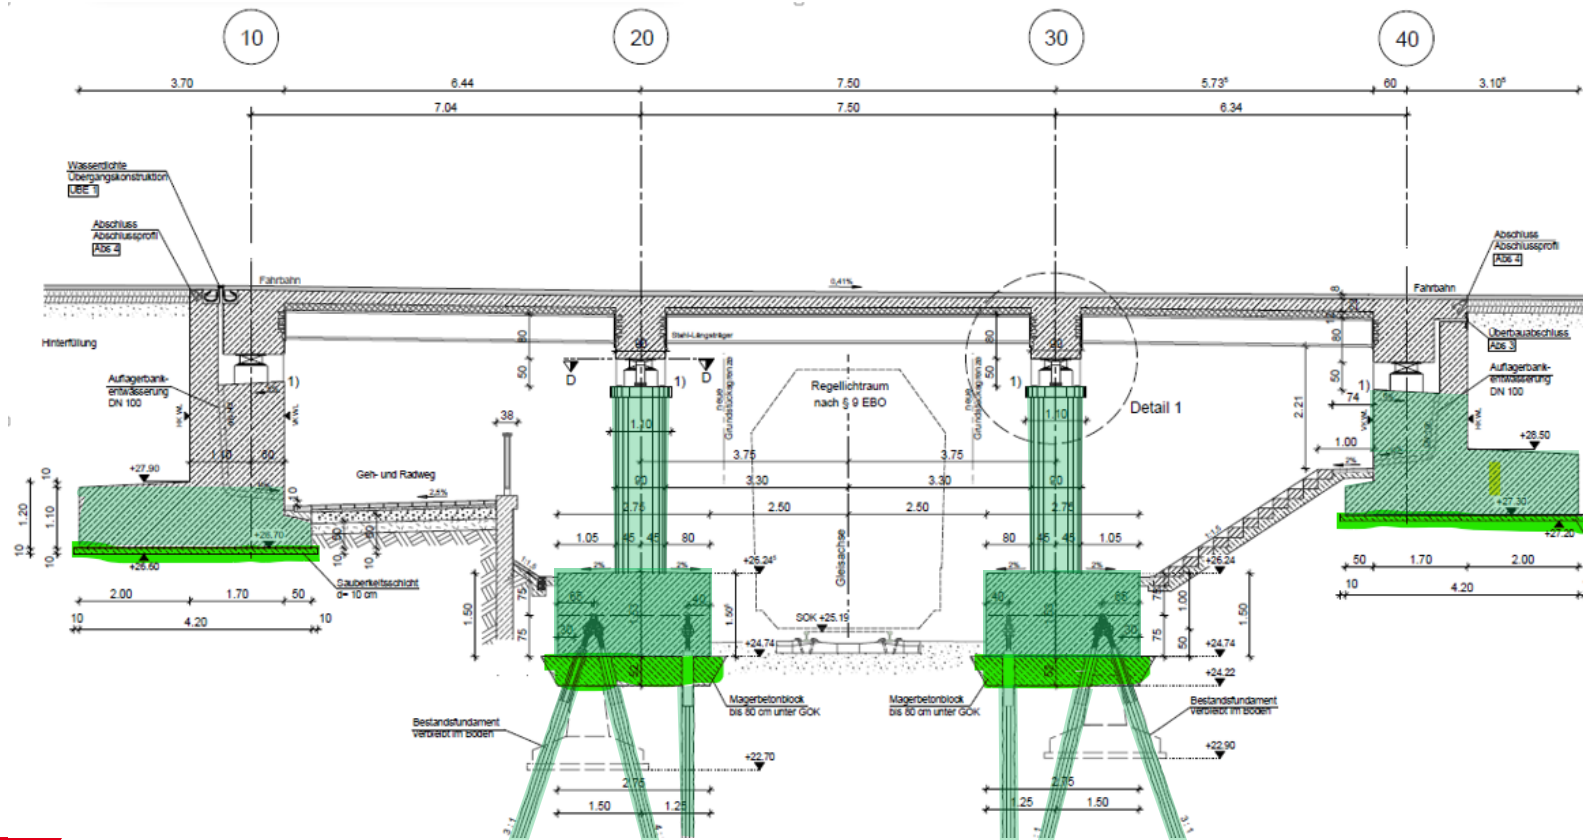

Aktueller Baufortschritt

Störfaktoren

- Ambitionierter - und damit für Störungen anfälliger - Bauablauf unter Berücksichtigung der umliegenden Maßnahmen
- Verspätete Vergabe aufgrund der derzeitigen Preisentwicklungen im Bausektor
- pandemiebedingte personelle Engpässe haben die ohnehin herausfordernde Aufgabe bei den beauftragten Firmen erschwert, dies führte zu Qualitätsproblemen mit Auswirkungen auf die Termine
- Priorisierung der Planungsleistung zum Einhalt der ersten Sperrpausen führte zu Verzögerungen bei nachfolgenden Meilensteinen
- Wechsel von Zulieferfirma.
- Störungen im Bauablauf (in den Abmessungen nicht bekannte Bauteile; Fehlbohrungen bei Ankerherstellung)
- Lieferengpässe bei Stahlerzeugnissen
- Dynamische Koordinierung mit umliegenden Maßnahmen (Curslacker Neuer Deich, Vierlandenstraße)
