



© Bezirksamt Altona

FREIRAUM OTTENSEN

DAS AUTOARME QUARTIER

Sitzung des Verkehrsausschusses

19.12.2022 | Hamburg



Hamburg

Rückblick 2022

- Abschluss Beteiligungsprozess und Dokumentation (März 2022)
- Erarbeitung und Beschluss Verkehrskonzept (bis Mai 2022)
- Planung und Umsetzung erster begleitender Maßnahmen im Projektgebiet + Nachbarschaftsfest (Juni – September 2022)
- Beauftragung und Start der Objektplanungen (November 2022)
- Aufstellung mobiler Radabstellanlagen (November 2022)

Beteiligung 2023 zu den Baumaßnahmen in der Ottenser Hauptstraße und Bahrenfelder Straße

„Nach Vorstellung der detaillierten Vorzugsvariante im Verkehrsausschuss sollen erneut die **Öffentlichkeit und insbesondere Anwohnende und Gewerbetreibende beteiligt** werden, um **konkrete Vorschläge für einzelne, ortsbezogene Maßnahmen** zuzulassen und in die jeweilige **Straßenplanung einzubinden.**“

Beschluss des Hauptausschusses der Bezirksversammlung Altona vom 14.04.2022 (Drucksache 21-2982B)

Beteiligung 2023 – Objektplanungen freiRaum Ottensen

Workshop „Ottenser Kreuz“

- Präsenzveranstaltung am **Samstag, 18. Februar 2023, 10-13 Uhr**
- Mehrere Varianten Gestaltung Ottenser Kreuz stehen zur Diskussion
- 40 Plätze (5 für verkehrspolitische Sprecher*innen der Fraktionen)

„Offener Redestand“ in Ottensen

- Bezirksamt lädt zum offenen Austausch und beantwortet Fragen zu freiRaum Ottensen am Mittwoch **22. Februar 2023, 15-19 Uhr**
- Aufgrund limitierter Workshopplätze ist dies ein ergänzendes Angebot für Bürger*innen und Gewerbetreibende, Fragen und Rückmeldungen zu den geplanten Maßnahmen an das Projektteam zu richten

Beteiligung Beirat

- Beirat erhält Varianten am 14. Februar 2023
- Stellungnahme dazu wird am 06. März 2023 im Verkehrsausschuss vorgestellt

Beteiligung im Frühjahr 2023

Dienstag, 14. Februar 2023
Beiratssitzung (Kurzvorstellung der Varianten)

Samstag, 18. Februar 2023
Workshop „Ottenser Kreuz“

Mittwoch, 22. Februar 2023
Offener Redestand in Ottensen

Montag, 06. März 2023
**Verkehrsausschuss (Präsentation Beteiligungsergebnisse,
Stellungnahme Beirat)**

Fachliche Abwägung und Einarbeitung der
Beteiligungsergebnisse


**Geplante
1. Verschickung**

Ausblick 2023

- Planung, Vergabe und erste Umsetzungsschritte der Westschleife (3) inkl. möglicher Fortsetzung der Gr. Brunnenstraße nach Beschluss des Verwaltungsgerichts
- Objektplanung (1+2): Erst- und Schlussverschickung sowie Beginn der Ausführungsplanung
- Beteiligung zur Maßnahme Ottenser Kreuz und offener Redestand in Ottensen (Februar 2023)

Priorisierung der Maßnahmen des Verkehrskonzepts

- 1 Objektplanung Ottenser Hauptstraße
- 2 Objektplanung Bahrenfelder Straße
- 3 Westschleife ("rot")
Unterbindung Nord-Süd-Querung
- 4 Ostschleife ("blau")
Osterkirchenviertel
- 5 Südostschleife ("grün")

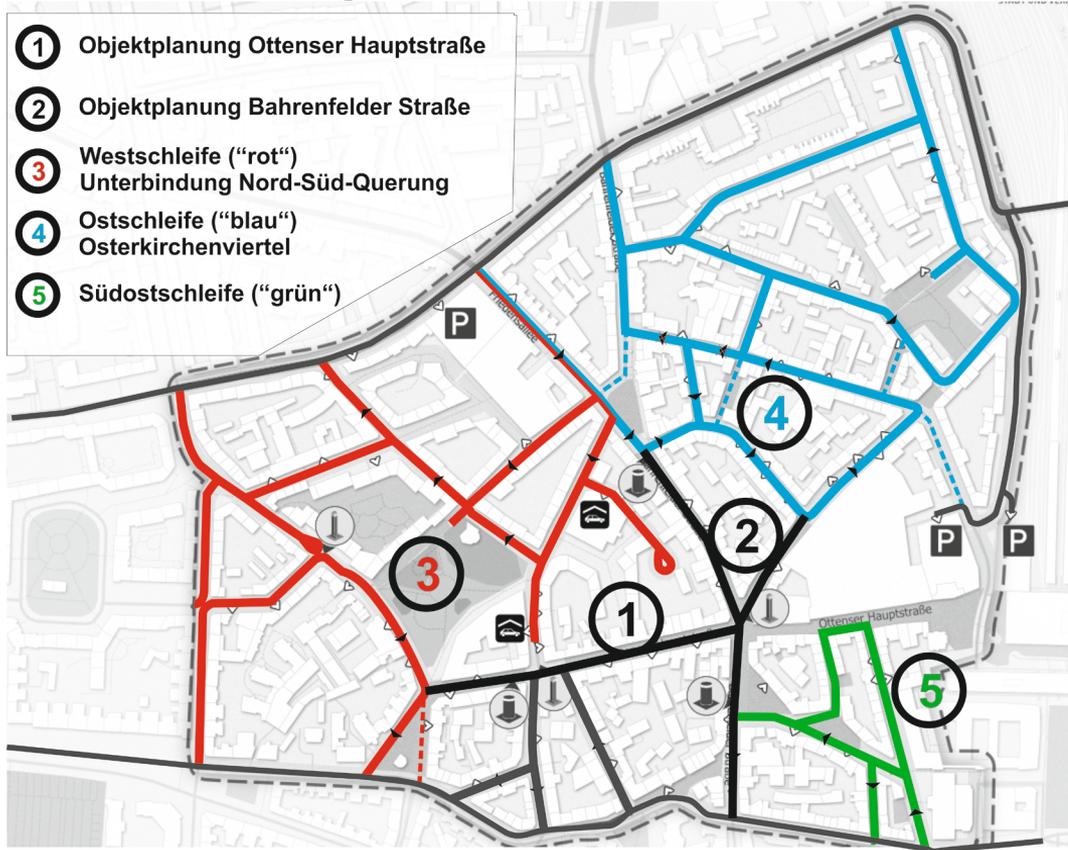

Prioritäten 1 und 2:

Bahrenfelder Straße und Ottenser Hauptstraße im Rahmen der Objektplanungen (gestartet im Herbst 2022)

Maßnahmen im übrigen Projektgebiet in drei nacheinander zu bearbeitenden Schleifen eingeteilt.

Übergreifende Maßnahmen, die das gesamte Projektgebiet betreffen und daher nicht verortet werden können, laufen parallel.

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT



© Bezirksamt Altona
