




## BAUSTELLENKOORDINATION ALTONA

Quartalsbericht 2/2021 - Verkehrsrelevante Straßenbaumaßnahmen

Stand 31.05.2021 | Verkehrsausschuss Bezirksversammlung Altona

# ALTONA - NORD

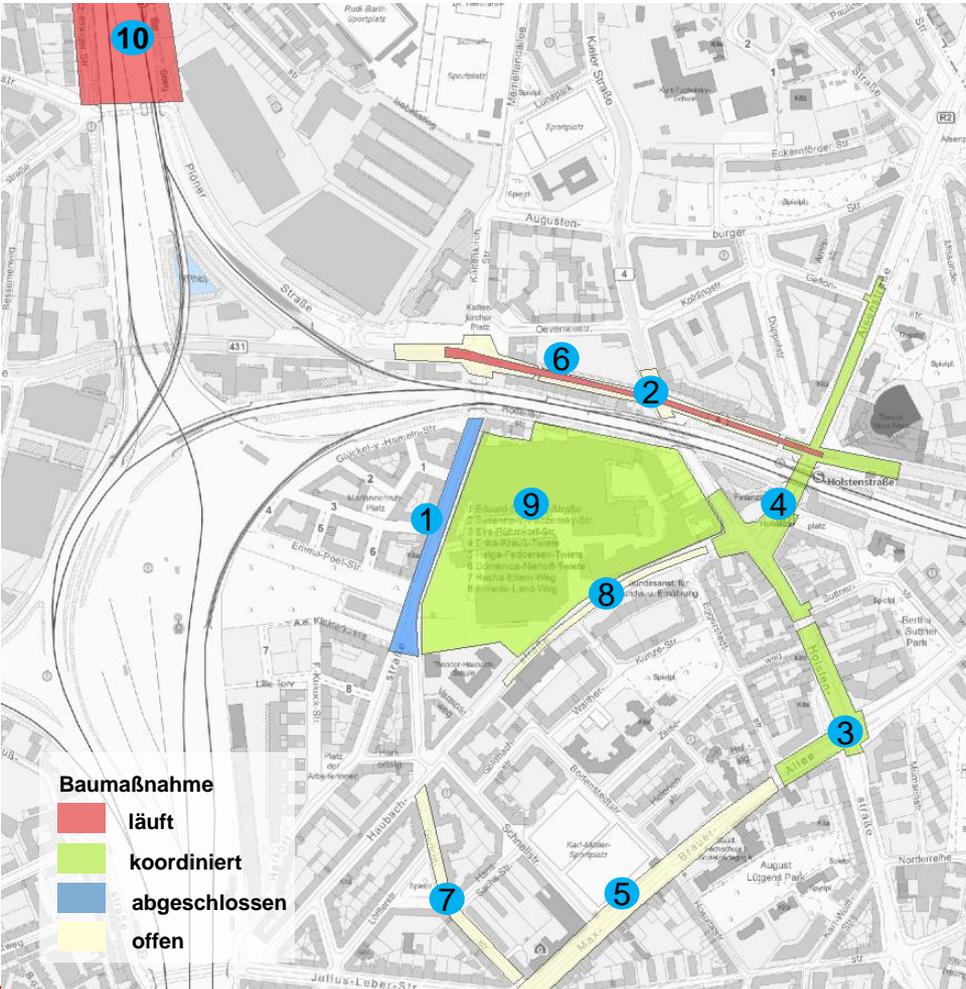


## Baumaßnahme


- läuft
- koordiniert
- abgeschlossen
- offen

1. Harkortstraße Nord (LSBG) - **abgeschlossen**
2. Sielsanierung (Hamburg Wasser) - **03/2021-09/2021**
3. Knoten Max-Brauer-Allee/Holstenstraße (LSBG) **06/2021-05/2022**
4. VR13 Holstenplatz (LSBG) - **geplant 03/2022 - 12/2023**  
(Kampfmittelsondierungsarbeiten Herbstferien 2021)
5. Max-Brauer-Allee 2./3. BA (LSBG) - **geplant 2022 – 2024**
6. Stresemannstraße (LSBG) - **geplant 06/2022 - Ende 2023**
7. VR 13 Gerichtsstraße (LSBG) - **geplant 2022**
8. Haubachstraße VR-Provisorium (BAA) - **geplant 2022/23**  
\* Abstimmung mit Holsten-Quartier
9. Holsten-Quartier - Beginn Abbruch - **06/2021**
10. Bf. Diebsteich - Vorbereitende Leitungsarbeiten **seit 04/2021**

# ALTONA - ALTSTADT

1. Kreisverkehr Virchowstr./Jessenstr. (BAA) **bis 06/2021**
2. Louise-Schröder-Straße (BAA) **geplant 05/2022 - 05/2023**
3. VR12 Königsstraße (einschließlich Leitungsarbeiten) **geplant 03/2022 – Ende 2023**

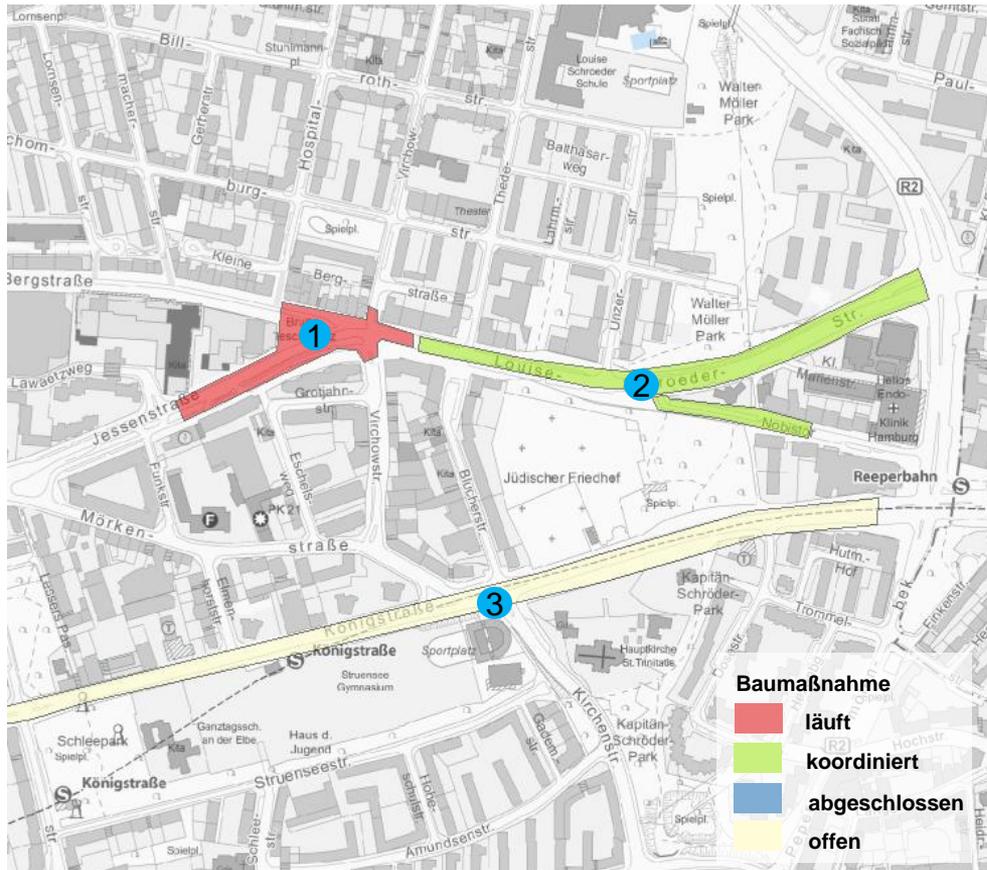

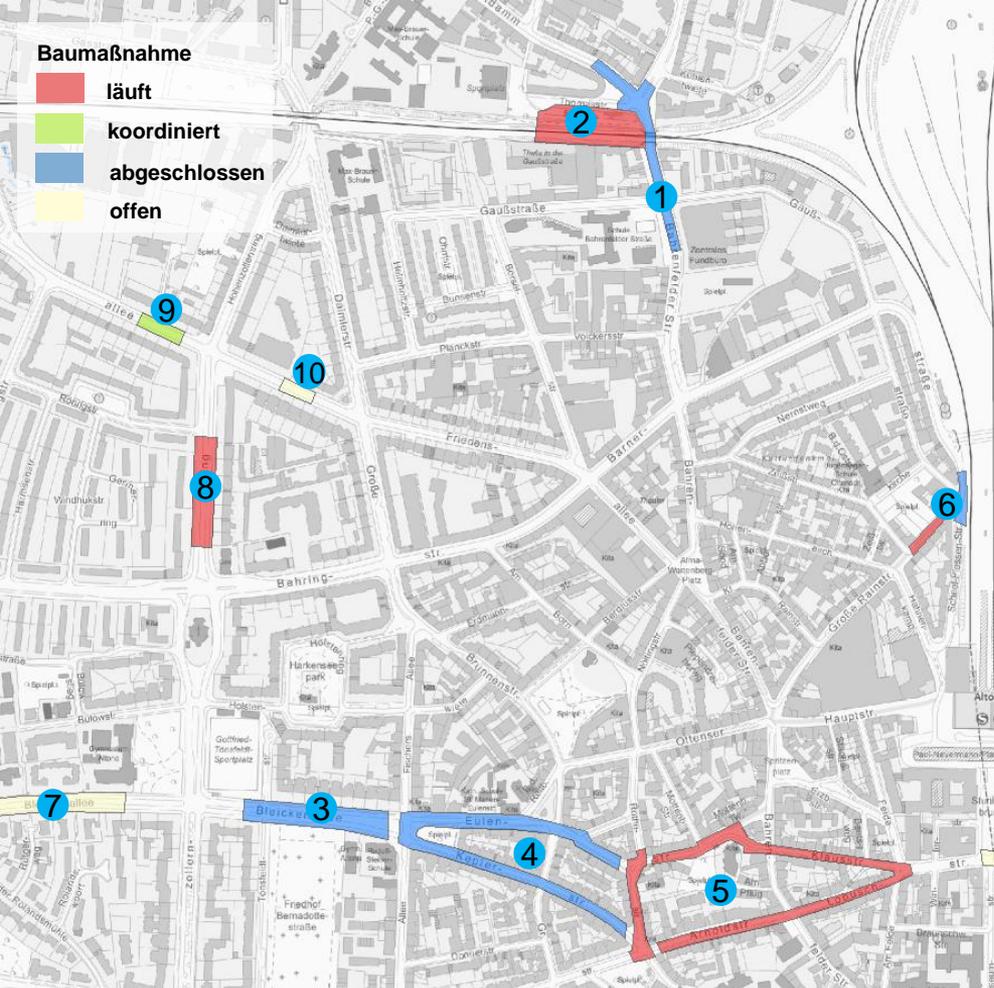


# OTTENSEN

1. Busbeschleunigung (LSBG) **abgeschlossen**
2. S-Bahnstation Ottensen (DB S&S) **08/2020 - 12/2021**
3. VR1 Ottensen -Bleickenallee Ost (BAA) **abgeschlossen**
4. VR1 Ottensen – Eulenstr./Keplerstr. (BAA) **abgeschlossen**
5. VR1 Ottensen – Klausstr./Arnoldstr./Lobuschstr./Rothestr. (BAA) **05/2020 - Ende 2021**
6. Sielsanierung 1.BP Scheel-Plessen-Str. (Hamburg Wasser) **abgeschlossen** (Große Rainstraße läuft weiter)
7. VR1 Bleickenallee West (BAA) **offen**
8. Leitungsarbeiten (Wärme Hamburg) **05/2021 - 06/2021**
9. Erschließung Kolbenhöfe II **06/2021 - 07/2021**
10. Erschließung Friedensallee 94 **geplant 07.2021**

# ALTONA WESTEN



# SÜLLDORFER KIRCHENWEG

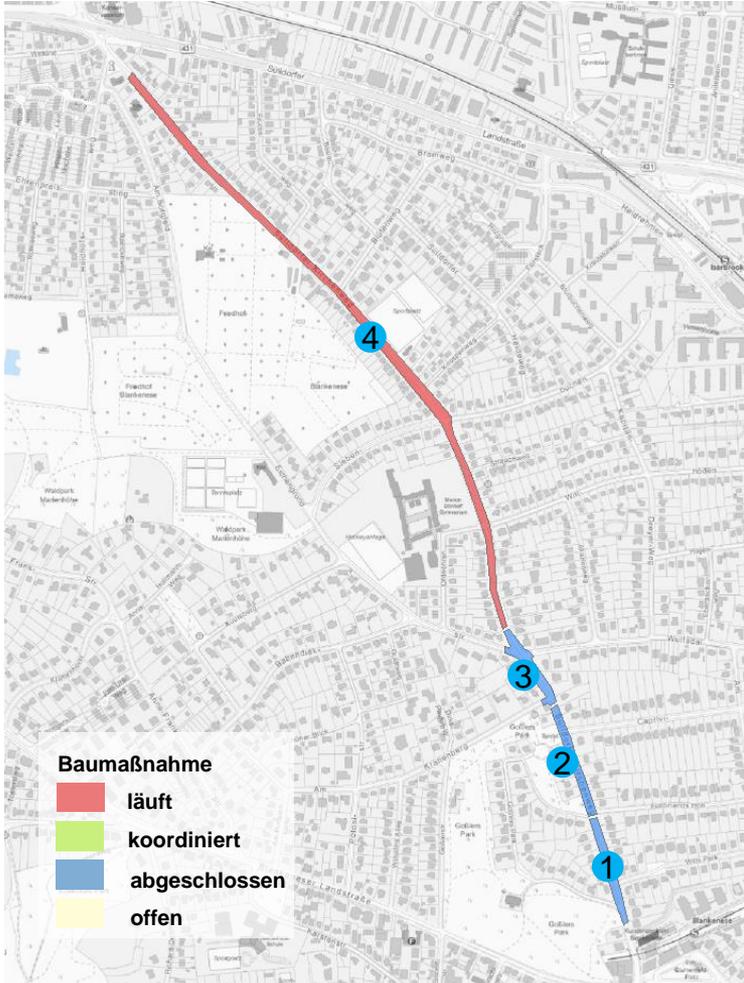

1. VR1 Blankenese Sülldorfer Kirchenweg 1. BA **abgeschlossen**

2. VR1 Blankenese Sülldorfer Kirchenweg 2. BA **abgeschlossen**

3. VR1 Blankenese Sülldorfer Kirchenweg 3. BA **abgeschlossen**

4. GI Sülldorfer Kirchenweg Vorbereitender Leitungsbau **01/2021 - 1Q. 2022** im Anschluss Straßenbaumaßnahme (BAA) **geplant 03/2022 - Mitte 2024**

# LURUP

1. GI Lüttkamp (BAA) **04/2021 - Ende 2021**
2. Deckensanierung Oderstraße (BAA) **geplant 3.Q/2021**
3. Sanierung L103 (LBV SH) **01/2023 - 12/2023**
4. Luruper Hauptstraße (LSBG) **geplant 03/2025 - 11/2026**
5. VR14 Elbgaustraße (LSBG) **geplant 04/2023 - 12/2024**

