



2. QUARTALSBERICHT 2022

BAUSTELLENKOORDINATION ALTONA

Verkehrsausschuss 02


02.05.2022

Stand: 26.04.2022

2. Quartalsbericht 2022 Baustellenkoordination Altona
Verkehrsrelevante Baumaßnahmen

Stand: 26.04.2022


ID Karte	Baumaßnahme	Veranlasser	Start	Ende	Art der Arbeit	Koordinierungsstatus	NEU
5	Grundinstandsetzung Elbchaussee, 1. BA	Hamburg Wasser	01.05.2021	31.03.2024	Straßenbau, Leitungsbau	01 Im Bau	
6	A7-Deckel Altona	DEGES, Autobahn GmbH	01.09.2019	Ende 2028	Straßenbau	01 Im Bau	
8	Leitungsarbeiten Sülldorfer Kirchenweg	div. Leitungsunternehmen	01.11.2020	31.12.2022	Leitungsbau	01 Im Bau	
12	Holstenquartier Neubau	Privat	01.06.2021	offen	Abbruch, Hochbau	01 Im Bau	
13	Bahnhof Diebsteich Neubau	Deutsche Bahn	01.04.2021	offen	Hoch-, Straßen- und Leitungsbau	01 Im Bau	
21	Erschließung EH-Gelände Bahrenfelder Kirchenweg	div. Leitungsunternehmen	01.09.2021	2. Q 2022	Leitungsbau	01 Im Bau	
29	Bahnstation S-Ottensen Neubau	Deutsche Bahn	01.08.2020	31.08.2022	Bahnhofsneubau	01 Im Bau	
32	Instandsetzung Nebenflächen Schenefelder Landstraße	LSBG	01.09.2021	30.06.2022	Straßenbau	01 Im Bau	
38	Erneuerung Trinkwasserleitung Stresemannstraße	Hamburg Wasser	17.01.2022	17.06.2022	Leitungsarbeiten	01 Im Bau	
45	Sielarbeiten Rondenbarg	Hamburg Wasser	17.01.2022	15.07.2022	Leitungsarbeiten	01 Im Bau	
16	Fernwärmetrasse FWS-West (Nord)	Wärme Hamburg	01.01.2022	01.06.2024	Leitungsbau	01 Im Bau	
42	Instandsetzungsmaßnahmen Sternbrücke	Deutsche Bahn	01.02.2022	31.12.2022	Sonstiges	01 Im Bau	
20	Sielsanierung Scheel-Plessen-Straße	Hamburg Wasser	07.07.2022	17.08.2022	Leitungsbau	02 Koordiniert	
22	VR.13 Holstenplatz	LSBG	01.09.2022	22.12.2023	Straßenbau	02 Koordiniert	
25	Louise-Schröder-Straße	Bezirksamt Altona	01.06.2022	01.05.2023	Straßenbau	02 Koordiniert	
26	VR.12 Königstraße	LSBG	01.07.2023	01.04.2025	Straßenbau	02 Koordiniert	
28	Sielsanierung Behringstr./Friedensallee/Von-Sauer-Str.	Hamburg Wasser	15.11.2021	01.04.2023	Leitungsarbeiten	02 Koordiniert	
33	Schachtsanierung Bahrenfelder Steindamm	Hamburg Wasser	01.06.2022	31.12.2022	Leitungsbau	02 Koordiniert	
41	Leitungsarbeiten Sternbrücke	Hamburg Wasser	01.08.2022	02.12.2022	Leitungsarbeiten	02 Koordiniert	
49	Instandsetzung Nebenflächen Holstenstraße / Stresemannstraße	LSBG	13.06.2022	10.12.2022	Tiefbauarbeiten	02 Koordiniert	Neu
47	Grundinstandsetzung Kaistraße	Bezirksamt Altona	16.05.2022	01.11.2022	Straßenbau	02 Koordiniert	
18	Grundinstandsetzung L103	Stadt Schenefeld	01.01.2023	01.12.2023	Straßenbau	03 Im Koordinationsprozess	
19	Grundinstandsetzung Sülldorfer Kirchenweg	Bezirksamt Altona	01.09.2022	31.12.2024	Straßenbau	03 Im Koordinationsprozess	
23	VR.13 Gerichtstraße	LSBG	01.06.2022	30.11.2022	Straßenbau	03 Im Koordinationsprozess	
27	Max-Brauer-Allee 2. BA	LSBG	01.03.2023	01.11.2024	Straßenbau	03 Im Koordinationsprozess	
31	Max-Brauer-Allee 3. BA	LSBG	01.03.2023	01.11.2024	Straßenbau	03 Im Koordinationsprozess	
48	Fernwärmeschluss ZRE Schnackenburgallee	Hamburger Energiewerke	01.01.2023	31.12.2024	Leitungsarbeiten	03 Im Koordinationsprozess	Neu
50	Velooutenausbau Kirchenstraße	LSBG	01.03.2023	01.05.2023	Straßenbau	03 Im Koordinationsprozess	Neu
9	VR.1 Ottensen	Bezirksamt Altona	01.05.2020	31.03.2022	Straßenbau	04 Abgeschlossen	
11	Knoten Max-Brauer-Allee / Holstenstraße	LSBG	23.07.2021	11.06.2022	Straßenbau	04 Abgeschlossen	
17	Deckensanierung Oderstraße	Bezirksamt Altona	01.02.2022	31.06.2022	Straßenbau	04 Abgeschlossen	
35	Deckensanierung Notkestraße	Bezirksamt Altona	01.02.2022	31.06.2022	Straßenbau	04 Abgeschlossen	
36	Deckensanierung Hemingst. Weg	Bezirksamt Altona	01.02.2022	31.06.2022	Straßenbau	04 Abgeschlossen	
37	Deckensanierung Baron-Voght-Straße	Bezirksamt Altona	01.02.2022	31.06.2022	Straßenbau	04 Abgeschlossen	
39	Hausanschluss Behringstraße	Hamburger Energiewerke	31.01.2022	28.02.2022	Leitungsarbeiten	04 Abgeschlossen	
40	55-Stunden Sperrung A7 / A7-Deckel Altona	Autobahn GmbH	18.02.2022	21.02.2022	Straßenbau	04 Abgeschlossen	
44	Instandhaltung Eisenbahnüberführung Holstenstraße	Deutsche Bahn	05.03.2022	18.03.2022	Brückenarbeiten	04 Abgeschlossen	
46	Hausanschluss Von-Sauer-Straße	Hamburg Wasser	14.02.2022	01.04.2022	Leitungsarbeiten	04 Abgeschlossen	

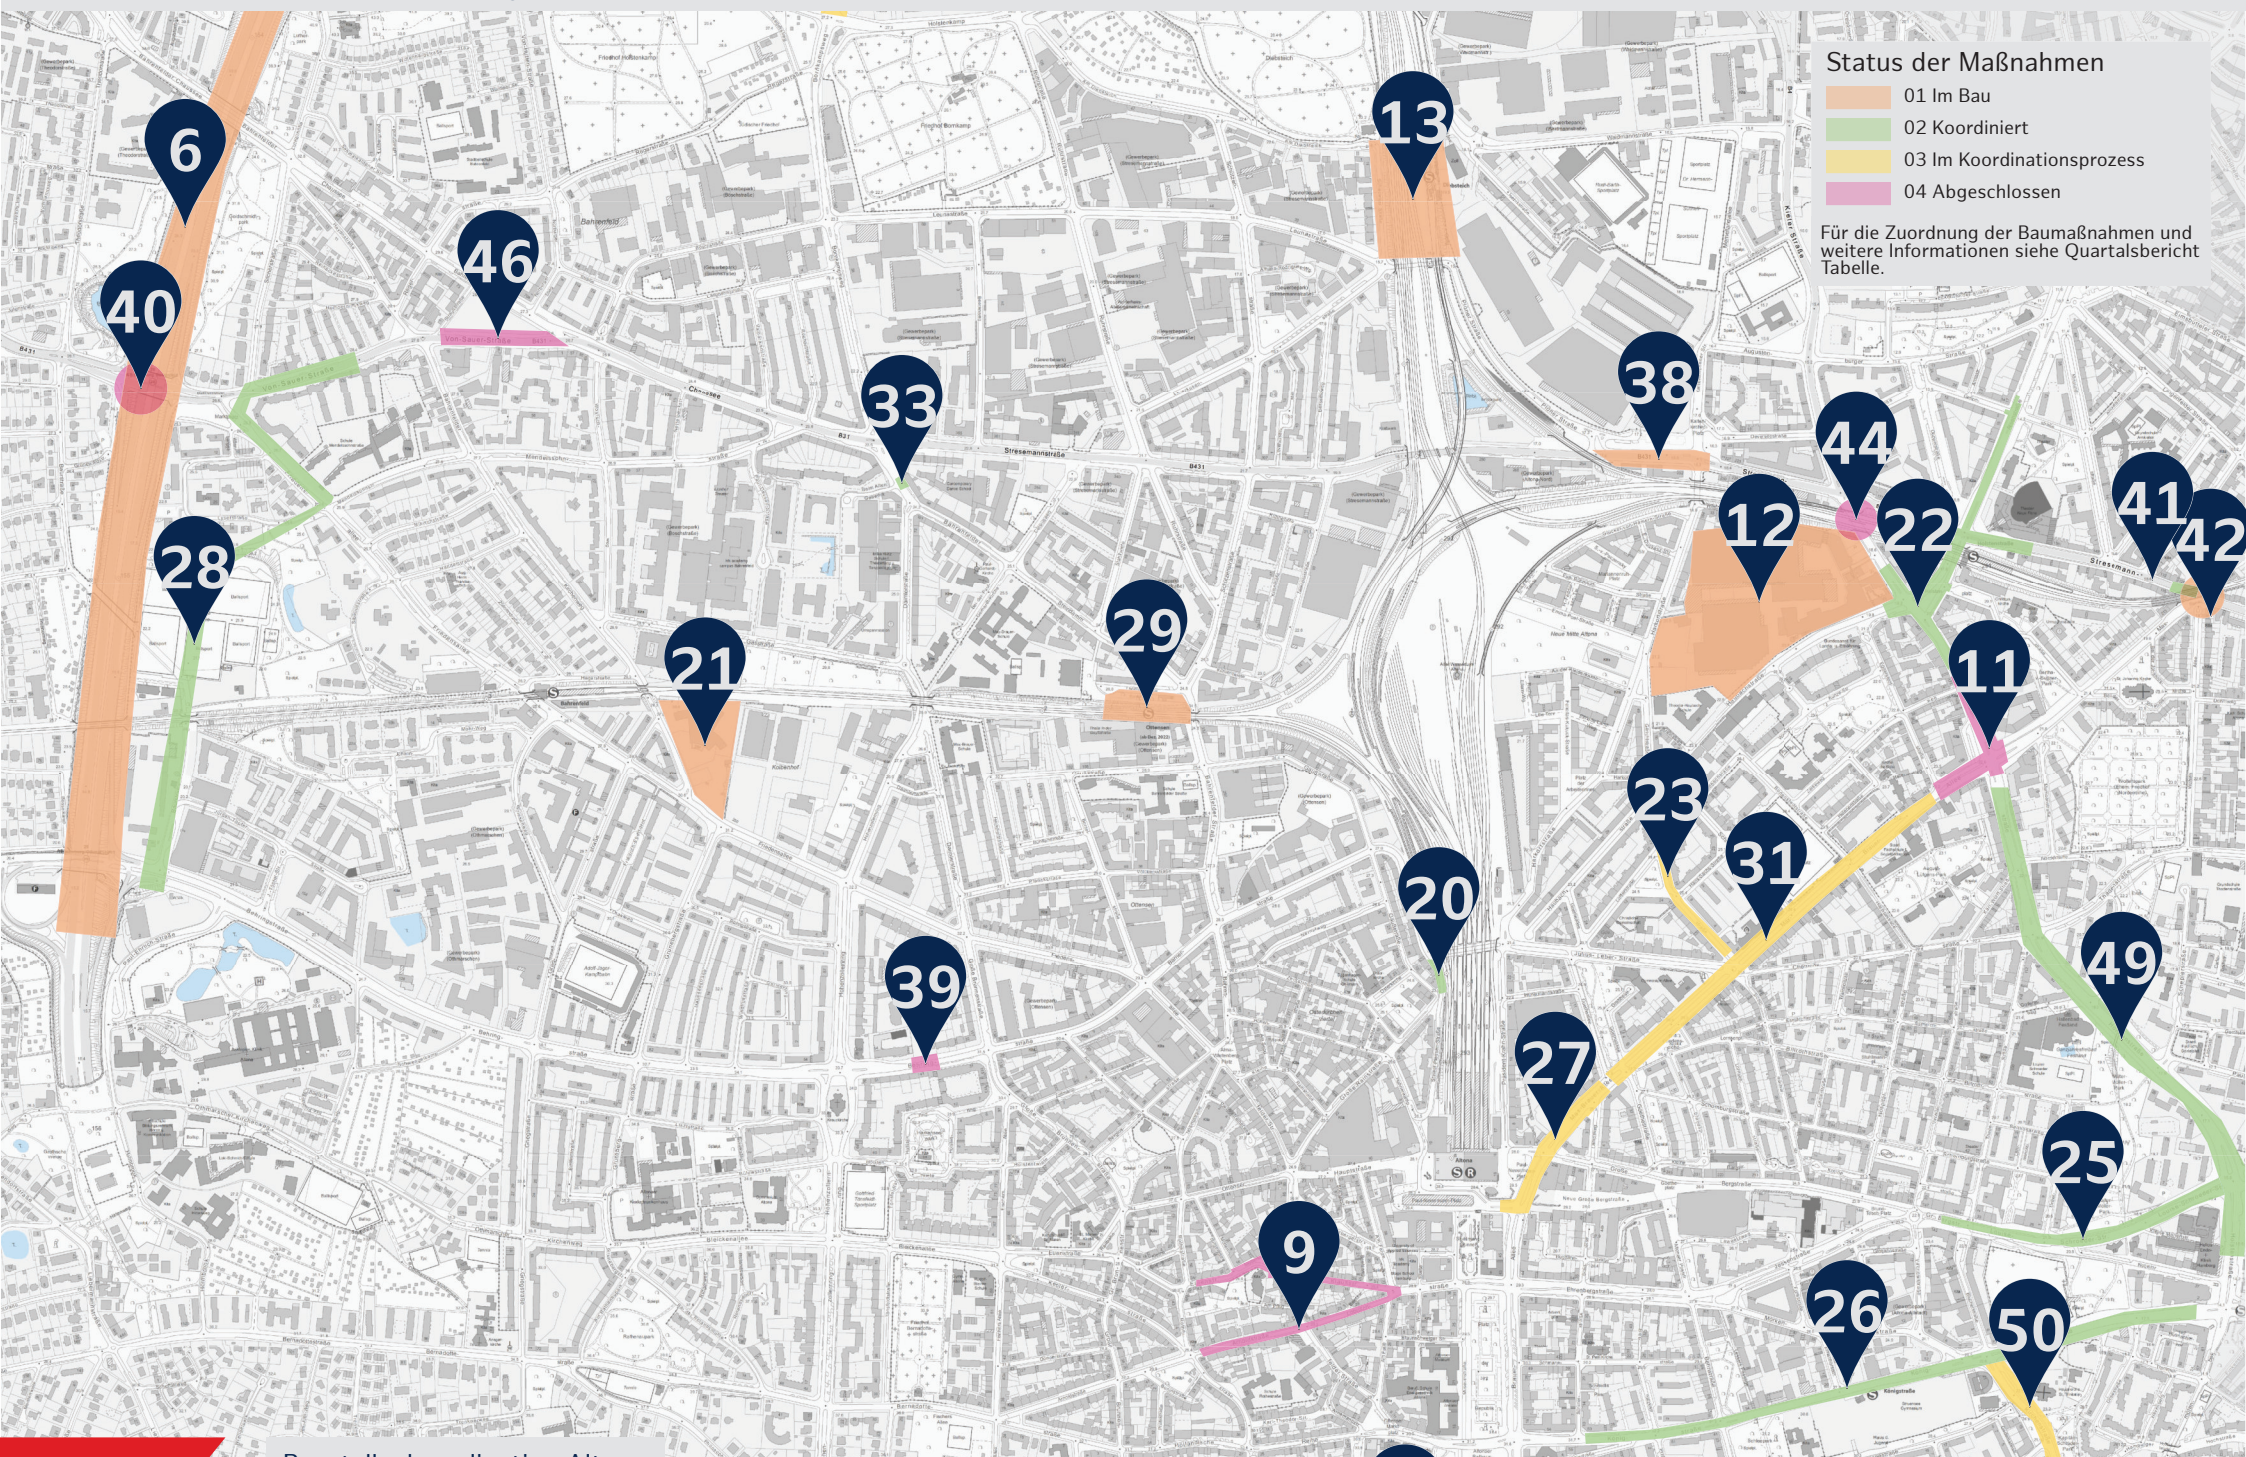

Status der Maßnahmen

- 01 Im Bau
- 02 Koordiniert
- 03 Im Koordinationsprozess
- 04 Abgeschlossen

Für die Zuordnung der Baumaßnahmen und weitere Informationen siehe Quartalsbericht Tabelle.

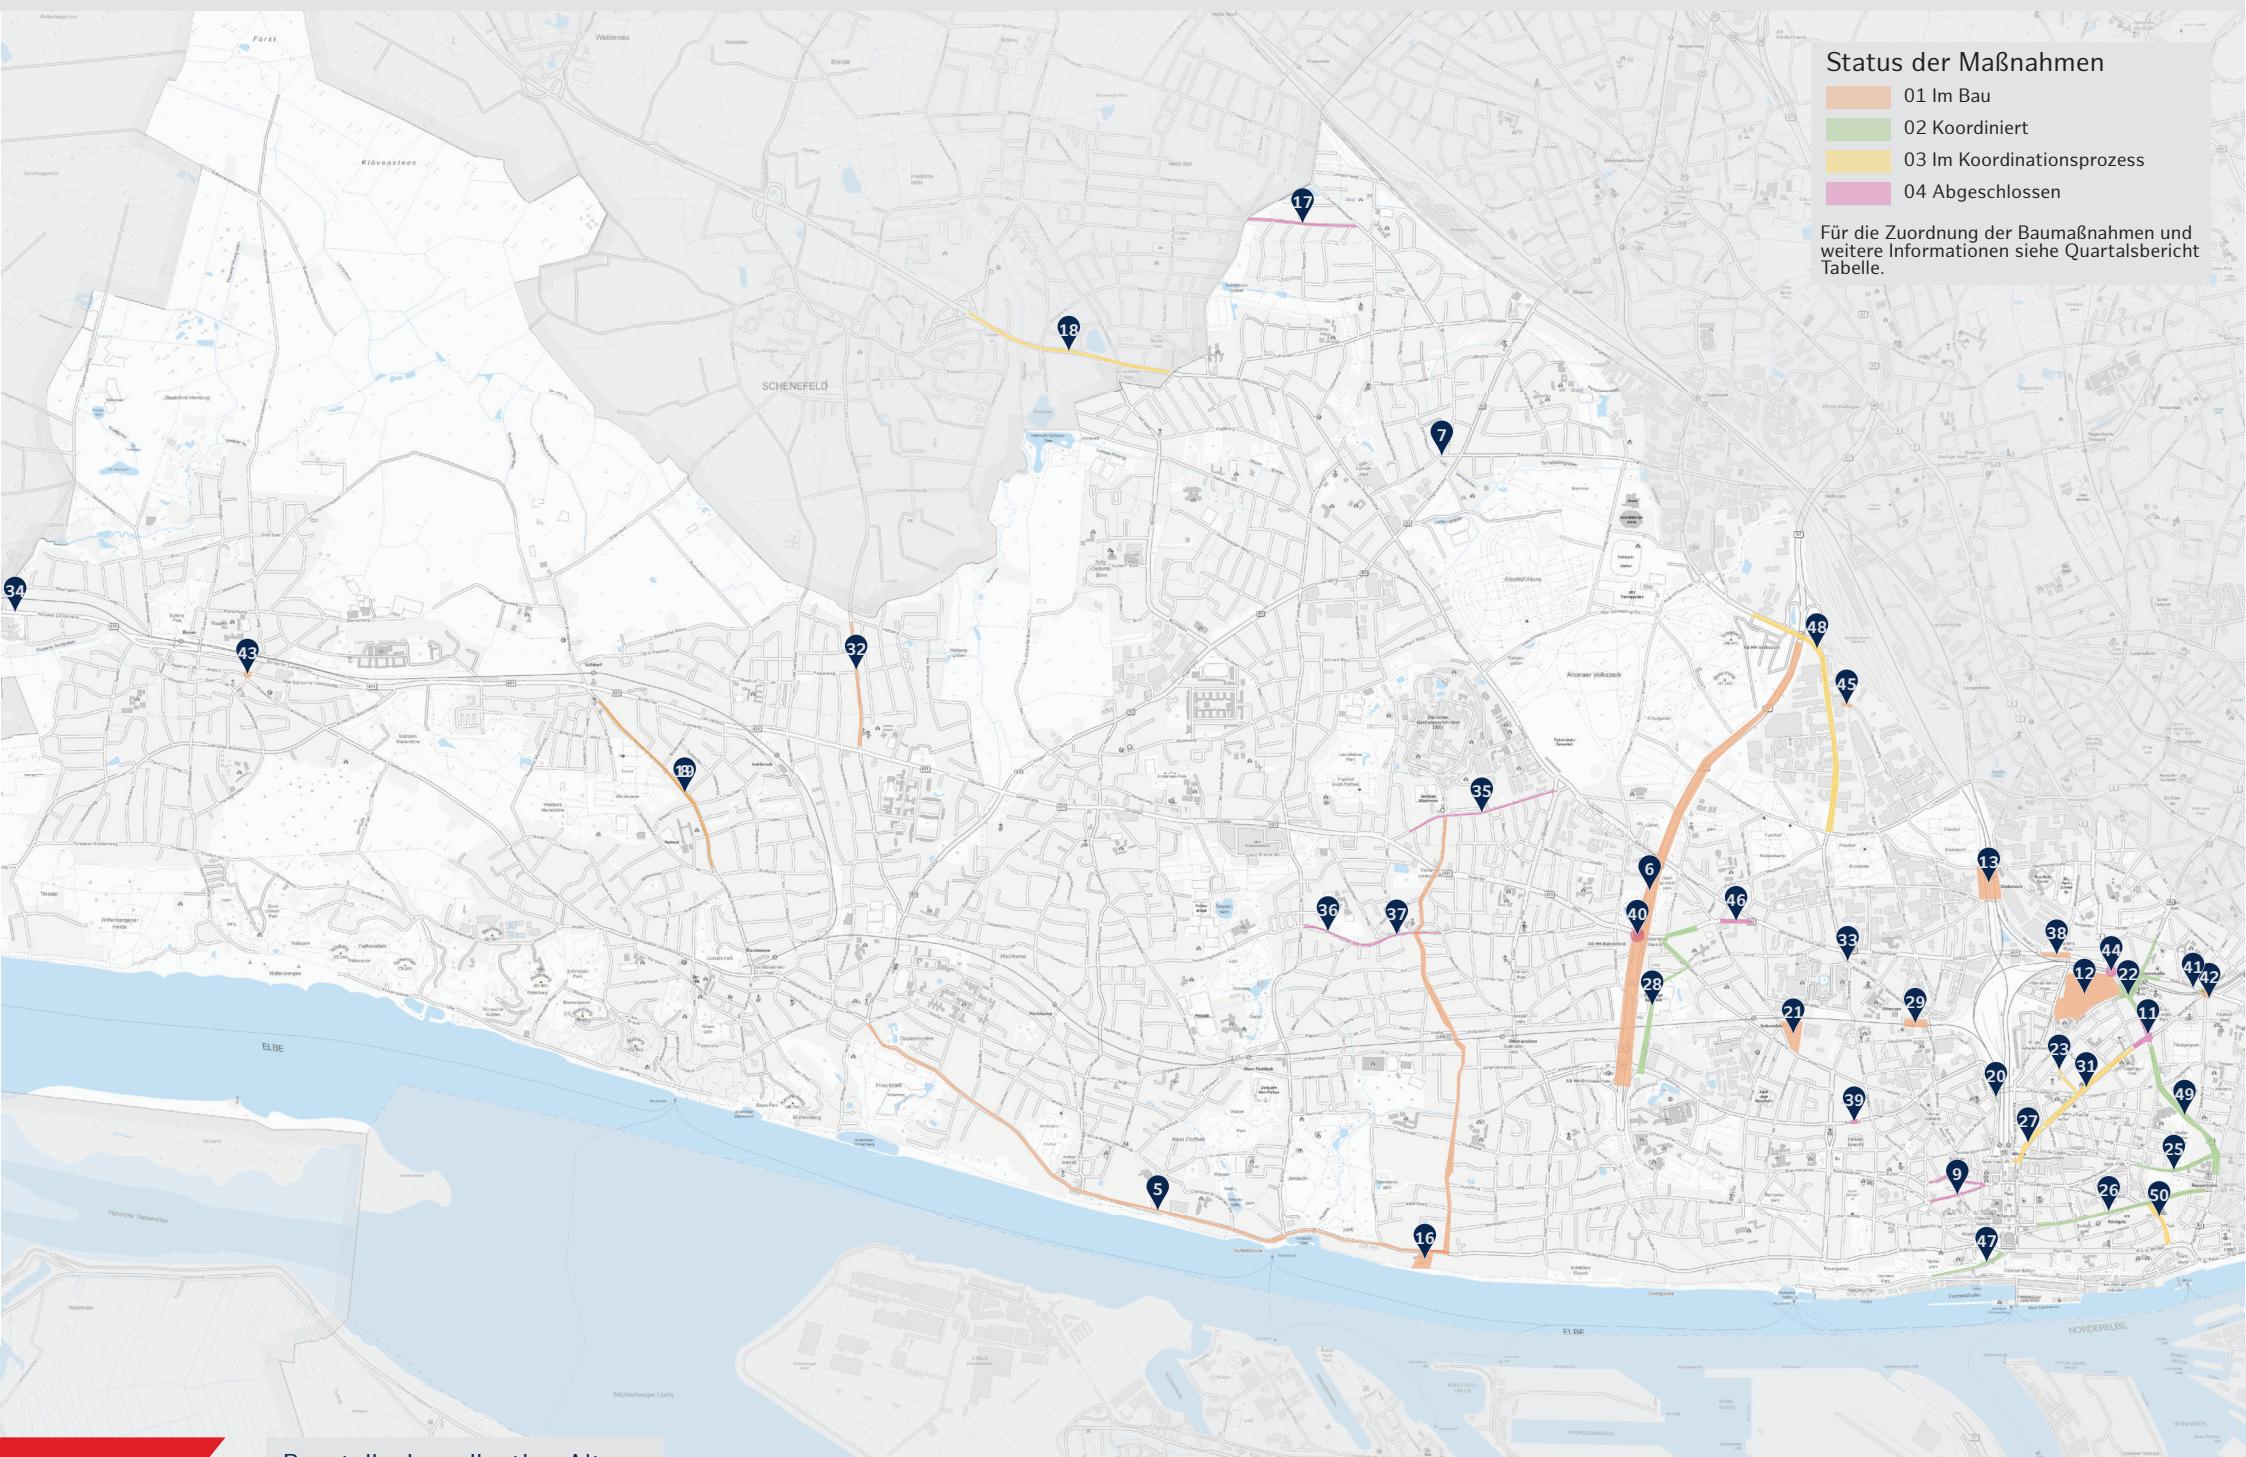

Status der Maßnahmen

- 01 Im Bau
- 02 Koordiniert
- 03 Im Koordinationsprozess
- 04 Abgeschlossen

Für die Zuordnung der Baumaßnahmen und weitere Informationen siehe Quartalsbericht Tabelle.
