

3. Quartalsbericht 2022 Baustellenkoordintaion Altona

Stand: 12.09.2022


Verkehrsrelevante Baumaßnahmen

ID Karte	Baumaßnahme	Veranlasser	Start	Ende	Art der Arbeit	Koordinierungsstatus	NEU
5	Grundinstandsetzung Elbchaussee, 1. BA	Hamburg Wasser	01.05.2021	31.03.2024	Straßenbau, Leitungsbau	01 Im Bau	
6	A7-Deckel Altona	DEGES, Autobahn GmbH	01.09.2019	Ende 2028	Straßenbau	01 Im Bau	
8	Leitungsarbeiten Sülldorfer Kirchenweg	div. Leitungsunternehmen	01.11.2020	31.12.2022	Leitungsbau	01 Im Bau	
12	Holstenquartier Neubau	Privat	01.06.2021	offen	Abbruch, Hochbau	01 Im Bau	
13	Bahnhof Diebsteich Neubau	Deutsche Bahn	01.04.2021	offen	Hoch-, Straßen- und Leitungsbau	01 Im Bau	
16	Fernwärmetrasse FWS-West (Nord)	Wärme Hamburg	01.01.2022	01.06.2024	Leitungsbau	01 Im Bau	
21	Erschließung EH-Gelände Bahrenfelder Kirchenweg	div. Leitungsunternehmen	01.09.2021	2. Q 2022	Leitungsbau	01 Im Bau	
16	Fernwärmetrasse FWS-West (Nord)	Wärme Hamburg	01.01.2022	01.06.2024	Leitungsbau	01 Im Bau	
28	Sielsanierung Behringstr./Friedensallee/Von-Sauer-Str.	Hamburg Wasser	15.11.2021	01.06.2023	Leitungsarbeiten	01 Im Bau	
21	Erschließung EH-Gelände Bahrenfelder Kirchenweg	div. Leitungsunternehmen	01.09.2021	2. Q 2022	Leitungsbau	01 Im Bau	
29	Bahnstation S-Ottensen Neubau	Deutsche Bahn	01.08.2020	31.12.2022	Bahnhofsneubau	01 Im Bau	
41	Leitungsarbeiten Sternbrücke	Hamburg Wasser	01.08.2022	02.12.2022	Leitungsarbeiten	01 Im Bau	
42	Instandsetzungsmaßnahmen Sternbrücke	Deutsche Bahn	01.02.2022	31.12.2022	Sonstiges	01 Im Bau	
43	Kreisverkehr Alte Sülldorfer Landstraße	Bezirksamt Altona	28.04.2022	30.09.2022	Straßenbau	01 Im Bau	
47	Grundinstandsetzung Kaistraße	Bezirksamt Altona	16.05.2022	01.11.2022	Straßenbau	01 Im Bau	
49	Instandsetzung Nebenflächen Holstenstraße / Stresemannstraße	LSBG	13.06.2022	10.12.2022	Tiefbauarbeiten	01 Im Bau	
55	Klopstockstraße	Hamburg Wasser	05.09.2022	16.09.2022	Leitungsarbeiten	01 Im Bau	Neu
22	VR.13 Holstenplatz	LSBG	06.03.2023	31.08.2024	Straßenbau	02 Koordiniert	
25	Louise-Schröder-Straße	Bezirksamt Altona	15.11.2022	01.05.2024	Straßenbau	02 Koordiniert	
26	VR.12 Königstraße	LSBG	01.07.2023	01.04.2025	Straßenbau	02 Koordiniert	
18	Grundinstandsetzung L103	Stadt Schenefeld	01.01.2025	01.12.2025	Straßenbau	03 Im Koordinationsprozess	
19	Grundinstandsetzung Sülldorfer Kirchenweg	Bezirksamt Altona	01.03.2023	31.12.2024	Straßenbau	03 Im Koordinationsprozess	
23	VR.13 Gerichtstraße	LSBG	01.03.2023	30.11.2023	Straßenbau	03 Im Koordinationsprozess	
27	Max-Brauer-Allee 2. BA	LSBG	01.03.2023	01.11.2024	Straßenbau	03 Im Koordinationsprozess	
31	Max-Brauer-Allee 3. BA	LSBG	01.03.2023	01.11.2024	Straßenbau	03 Im Koordinationsprozess	
48	Fernwärmesanschluss ZRE Schnackenburgallee	Hamburger Energiewerke	19.12.2022	31.12.2024	Leitungsarbeiten	03 Im Koordinationsprozess	
50	Velooutenausbau Kirchenstraße	LSBG	01.03.2023	01.05.2023	Straßenbau	03 Im Koordinationsprozess	
51	Veloroutenausbau VR1 Reventlowstraße	Bezirksamt Altona	01.01.2024	31.12.2024	Straßenbau	03 Im Koordinationsprozess	Neu
52	EÜ Sternbrücke / Neubau	Deutsche Bahn	01.01.2023	31.12.2026	Brückenbau	03 Im Koordinationsprozess	Neu
53	EÜ Schanzenstraße	Deutsche Bahn	27.07.2024	26.06.2026	Brückenbau	03 Im Koordinationsprozess	Neu
54	Veloroutenausbau VR14 Elbgaustraße	LSBG	01.10.2023	31.12.2024	Straßenbau	03 Im Koordinationsprozess	Neu
33	Schachtsanierung Bahrenfelder Steindamm	Hamburg Wasser	01.06.2022	31.12.2022	Leitungsbau	04 Abgeschlossen	
45	Sielarbeiten Rondenbarg	Hamburg Wasser	17.01.2022	15.07.2022	Leitungsarbeiten	04 Abgeschlossen	

Status der Maßnahmen

- 01 Im Bau
- 02 Koordiniert
- 03 Im Koordinationsprozess
- 04 Abgeschlossen

Für die Zuordnung der Baumaßnahmen und weitere Informationen siehe Quartalsbericht Tabelle.

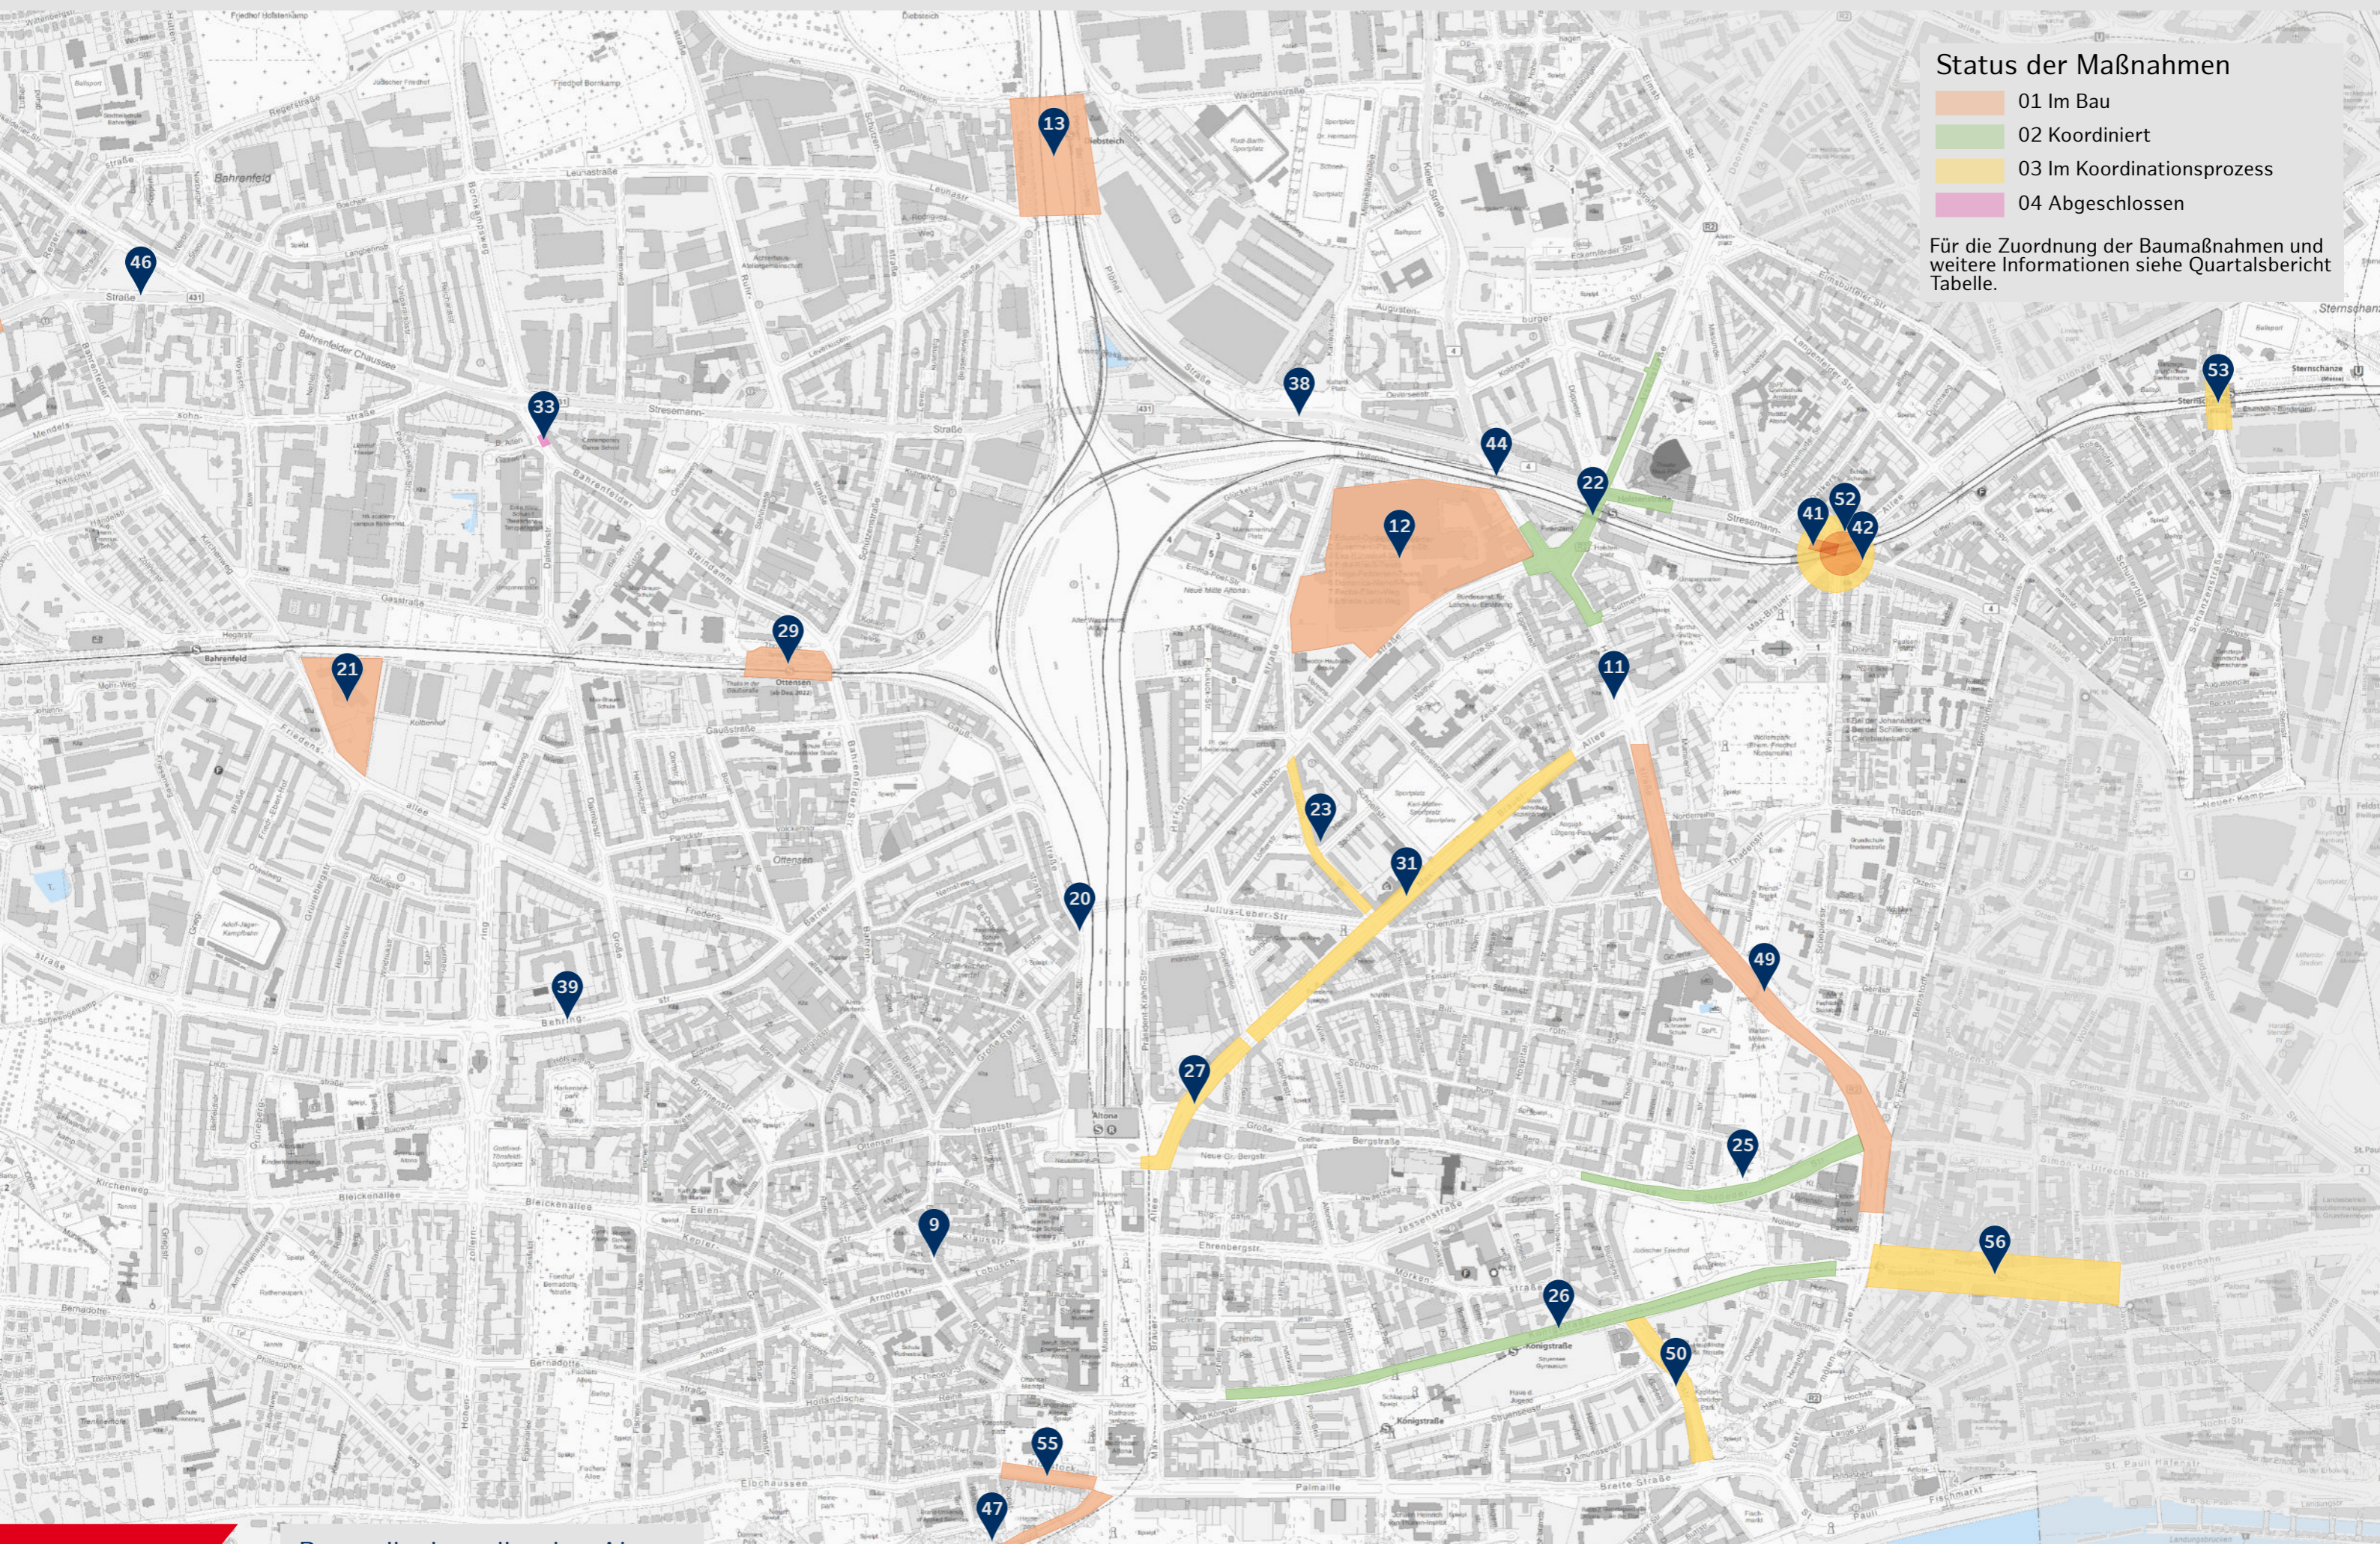

Status der Maßnahmen

- 01 Im Bau
- 02 Koordiniert
- 03 Im Koordinationsprozess
- 04 Abgeschlossen

Für die Zuordnung der Baumaßnahmen und weitere Informationen siehe Quartalsbericht Tabelle.

