Abschnitt 9 - Bauzeitenkostenplan

HU-Bau
Tangstedter Landstraße

Stand: 30.01.2018
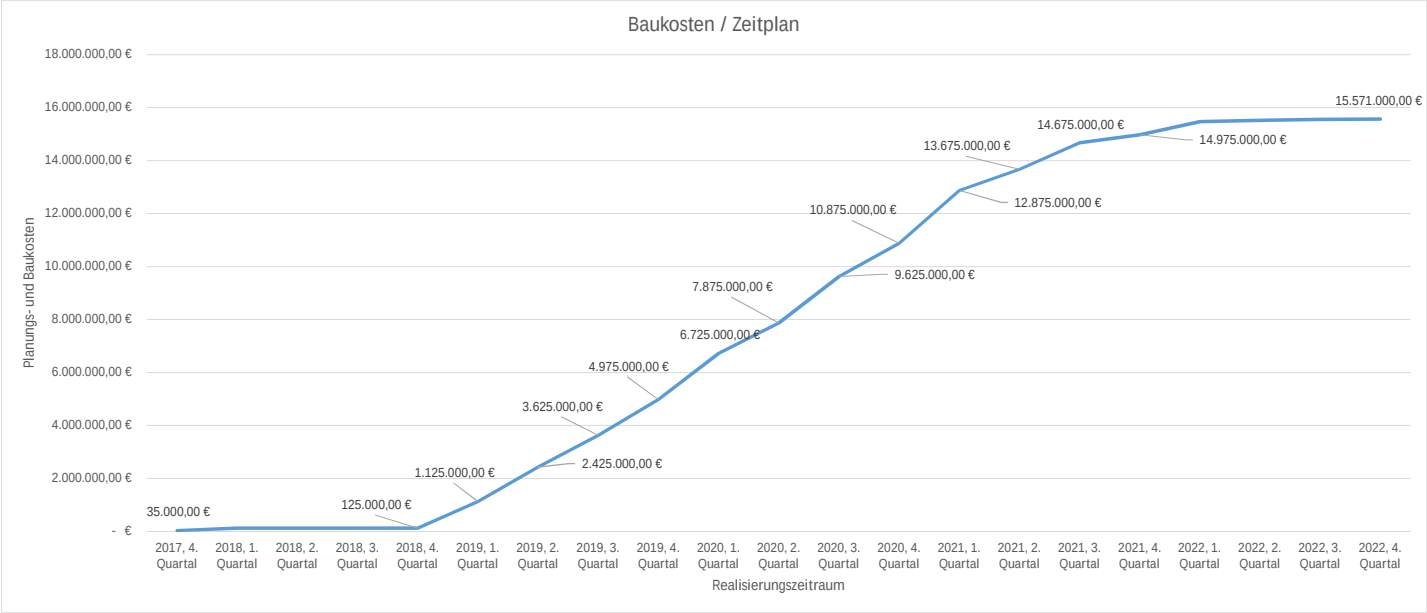
		2017	2018				2019				2020				2021				2022				
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Planung	Vermessung & Voruntersuchungen																						
	Prüfungen / Untersuchungen																						
	HU-Bau																						
	Ausschreibung der Planung (EU-weit)																						
	Planung der Maßnahme																						
	Ausschreibung der Gesamtmaßnahme																						
Bauzeiten	Baumfällarbeiten																						
	Abschnitt 1																						
	Abschnitt 2																						
	Abschnitt 3																						
	Abschnitt 4																						
	Abschnitt 5																						
	Pflege Straßenbegleitgrün																						
	Jährlicher Mittelbedarf (KM)		90.000,00 €				4.850.000,00 €				5.900.000,00 €				4.100.000,00 €				596.000,00 €				**15.571.000,00 €**
