



BAUSTELLENKOORDINATION

IM BEZIRK HAMBURG-NORD

Ausschuss Klima – Umwelt - Mobilität der Bezirksversammlung HH-Nord

22.06.2022

AGENDA

- 01 Zielsetzung und Herausforderungen
- 02 Aufgabenbereiche der Baustellenkoordination
- 03 Beteiligte und Zuständigkeiten
- 04 Einbindung bezirklicher Gremien

ZIELSETZUNG UND HERAUSFORDERUNGEN



Hamburg

Senatsdrucksache Nr. 21/15573

Verkehrsflussoptimierung durch verbesserte Koordinierung

Enge Verzahnung aller Wegebausträger, insbesondere der sieben Bezirksämter, der HPA, der Leitungsträger und der Koordinierungsstelle für Baumaßnahmen auf den Hauptverkehrsstraßen (KOST; fungiert autark im LSBG für die BVM).

Ziel: Koordinierung der Baumaßnahmen, sodass diese die möglichst geringsten Auswirkungen auf die Verkehrsteilnehmer*innen haben. (bündeln oder entzerren)

Allerdings können Auswirkungen nicht gänzlich verhindert werden -> Baustellen werden immer spürbar sein

Senatsdrucksache Nr. 21/15573


Verkehrsflussoptimierung durch verbesserte Koordination

Enge Verzahnung aller Wegebaustraßen, insbesondere der sieben Bezirksämter, der HPA, der Leitungsträger und der Koordinierungsstelle für Baumaßnahmen auf den Hauptverkehrsstraßen (KOST).

→ Mitte 2019 eigene
Baustellenkoordinatoren
in den sieben Bezirksämtern.



Quelle: Hamburger Abendblatt

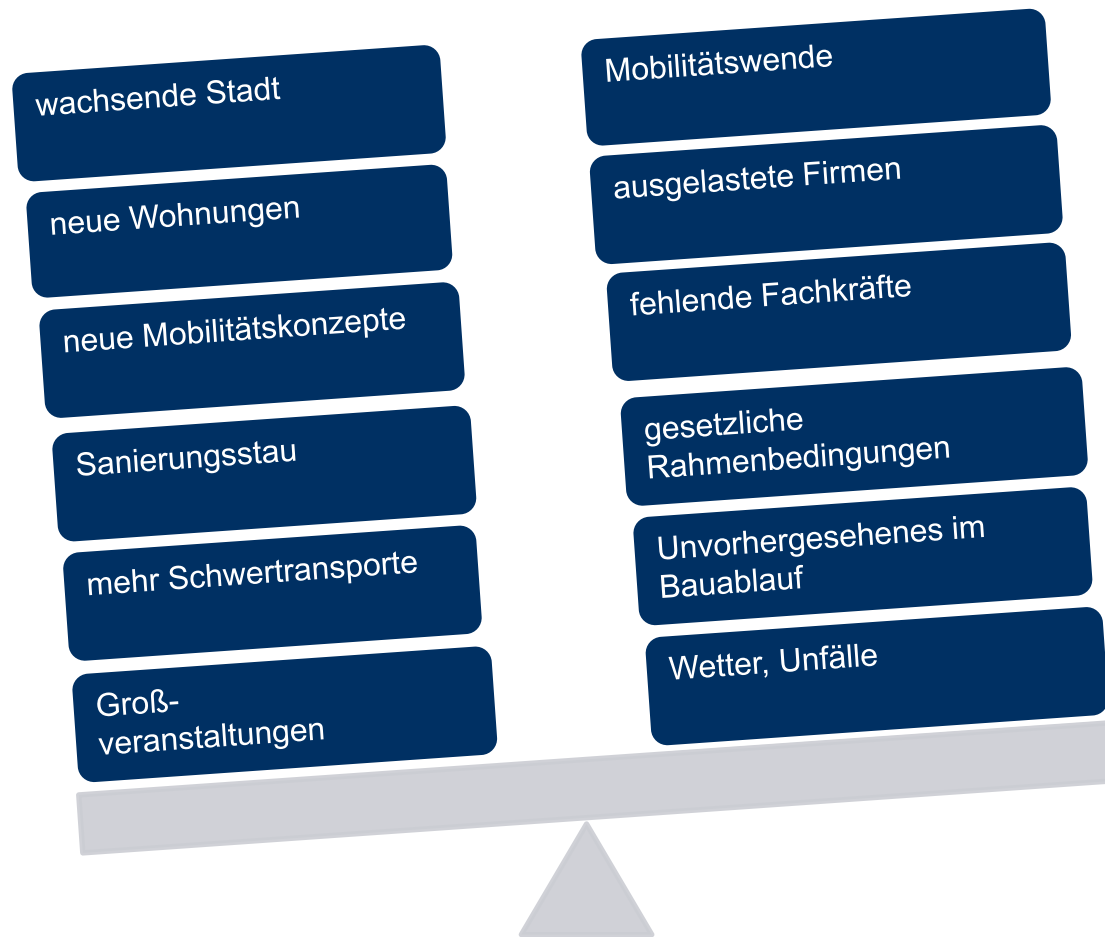

AUFGABENBEREICHE DER BAUSTELLENKOORDINATION



Hamburg

Kommunikation

- Steckbriefe
- Baustellenschild
- Anliegerinfo
- Pressemitteilung
- Homepage

Koordination

- Daten
- Absprachen
- umliegende Maßnahmen

Kooperation

- langfristige Planung
- Kooperation erkennen
- Maßnahmen zusammenlegen


www.mediaserver.hamburg.de / Maxim Schulz

HOMEPAGE

www.hamburg.de/baustellen


Baustellen in Hamburg

Unsere Karte zeigt Ihnen die Standorte aktueller Baustellen auf den Bundesfern- und Hauptverkehrsstraßen in Hamburg. Mit Klick auf das Symbol öffnet sich ein Fenster mit Detailinformationen.

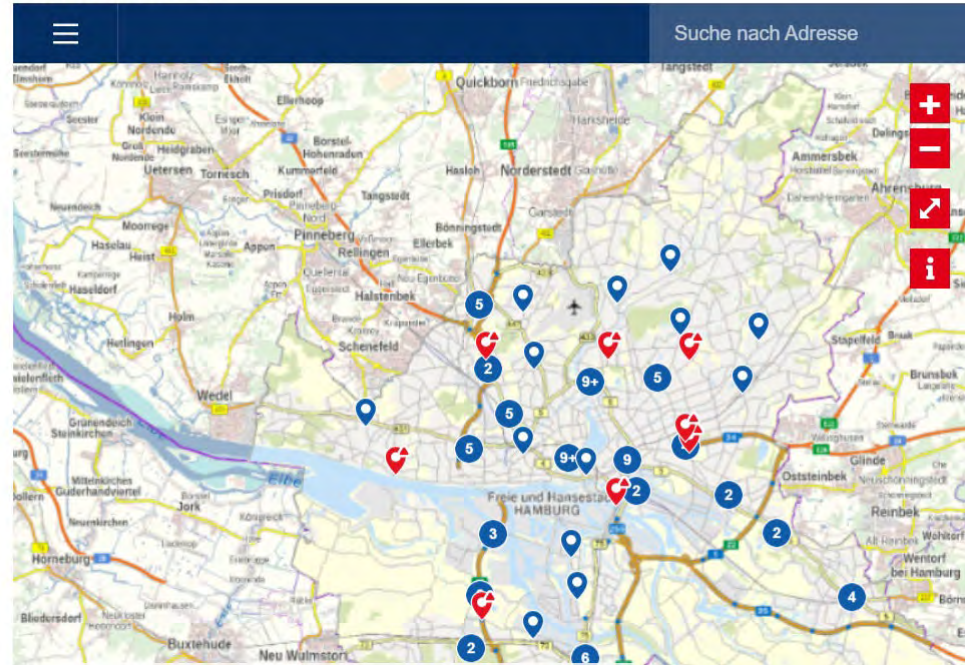


- Bezirke, LSBG, Leitungsträger, Hochbahn, HPA
- **eingetragen** werden alle verkehrsrelevanten Maßnahmen
- **veröffentlicht** wird eine Auswahl der eingetragenen Maßnahmen
- Verlinkungen zu Homepage, Anliegerinfo, Pressemitteilung und Baustellenhotline
- Sämtliche Daten werden digital verarbeitet

www.hamburg.de/baustellen



Unsere Karte zeigt Ihnen die Standorte aktueller Baustellen auf den Bundesfern- und Hauptverkehrsstraßen in Hamburg. Mit Klick auf das Symbol öffnet sich ein Fenster mit Detailinformationen.

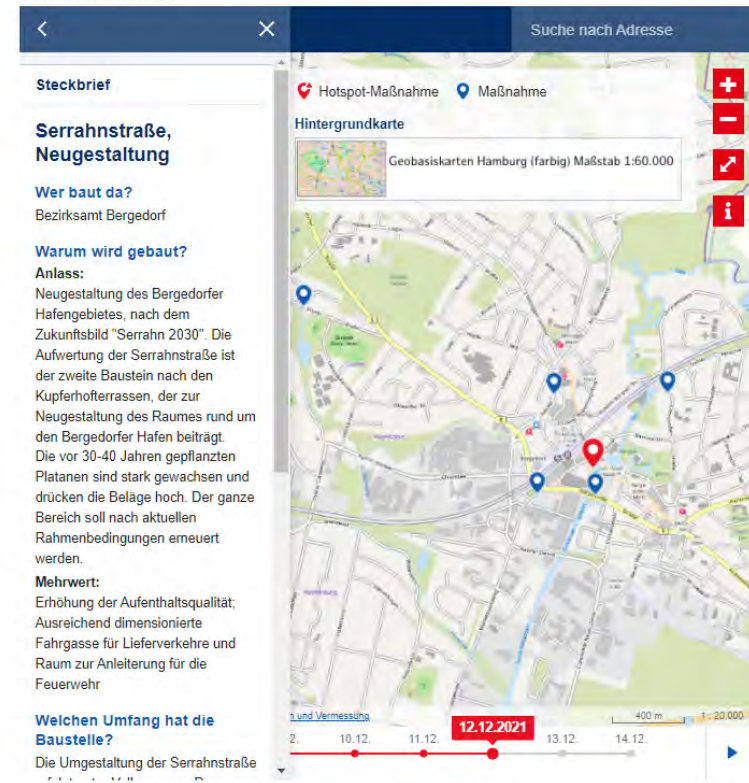

PRESSE- MITTEILUNG

Baustellenticker: 
Vollsperrung Maienweg, Höhe Haus 104 am 14. Mai 

Der Maienweg wird aufgrund von Kranarbeiten am 14. Mai zwischen Am Brabandkanal und Sengemannstraße vollgesperrt. 

Das Bezirksamt empfiehlt, in dieser Zeit die Baustelle möglichst weiträumig zu umfahren. 



Bezirksamt Hamburg-...  · 5T · ...

#Baustellenticker: Der **#Maienweg** wird aufgrund von Kranarbeiten am 14. Mai zwischen Am Brabandkanal und **#Sengemannstraße** vollgesperrt. Das Bezirksamt empfiehlt, in dieser Zeit die Baustelle möglichst weiträumig zu umfahren.



#Baustellenticker



BETEILIGTE UND ZUSTÄNDIGKEITEN



Hamburg

Kommunikation

- Steckbriefe
- Baustellenschild
- Anliegerinfo
- Pressemitteilung
- Homepage


Koordination

- Daten
- Absprachen
- umliegende Maßnahmen


Kooperation

- langfristige Planung
- Kooperation erkennen
- Maßnahmen zusammenlegen

BETEILIGTE

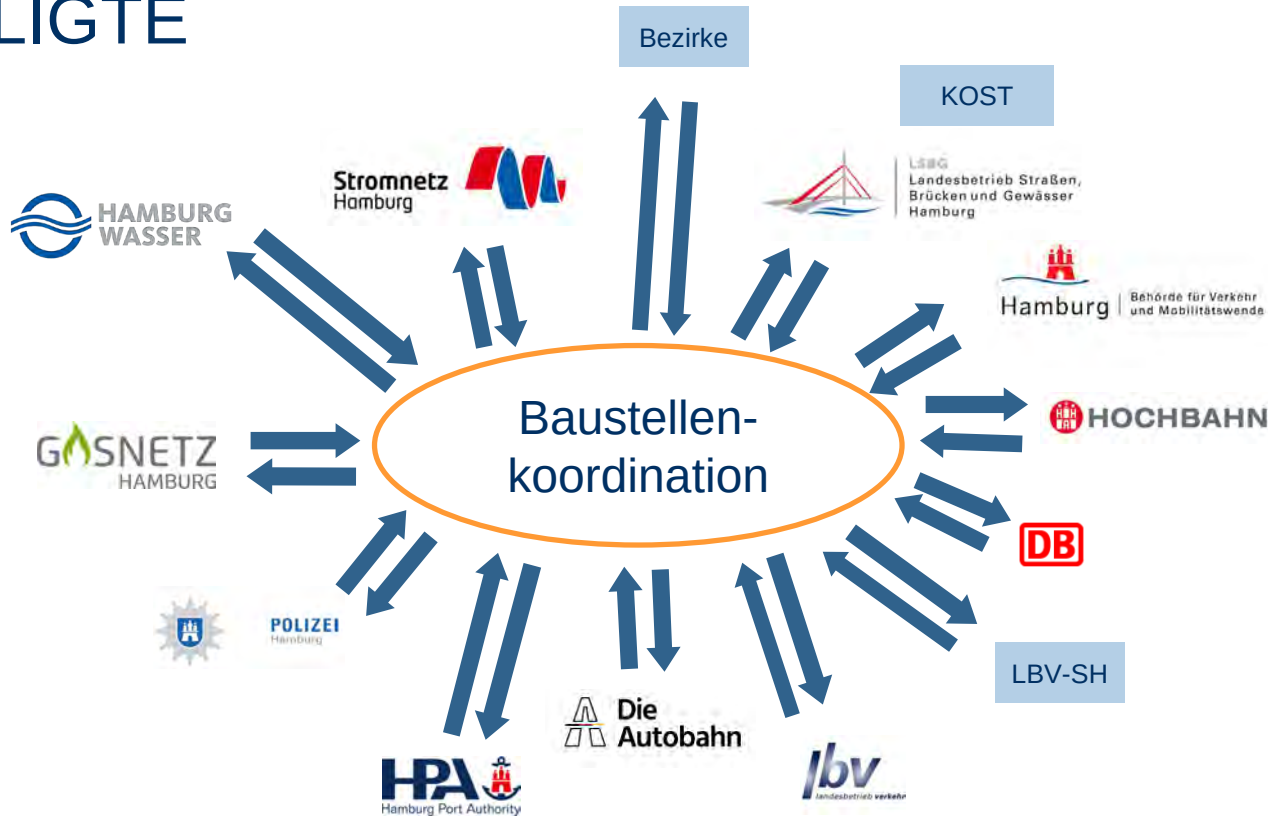

STRAßENSITUATION

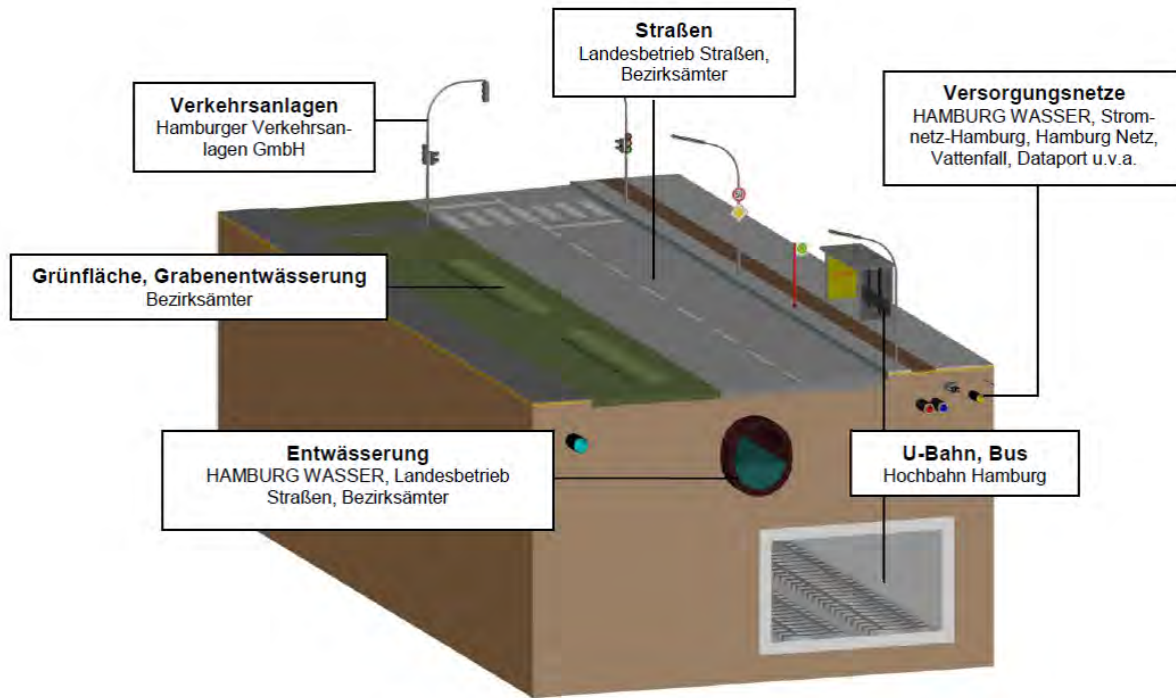

Viel Infrastruktur benötigt viele Baulastträger.

Wenn alle bauen wollen, entsteht Chaos.

Daher muss es eine Koordinierung geben, die alle unterstützen.


Bedenke: Die Ver- und Entsorgung muss sichergestellt sein. D.h. die Koordination hat auch Grenzen. Ziel ist dann aber die Einschränkungen zu minimieren

Quelle: Hamburg Wasser

INFRASTRUKTURNETZE ÜBER UND UNTER DER ERDE VON HAMBURG



STRAßEN
ÖPNV-NETZ

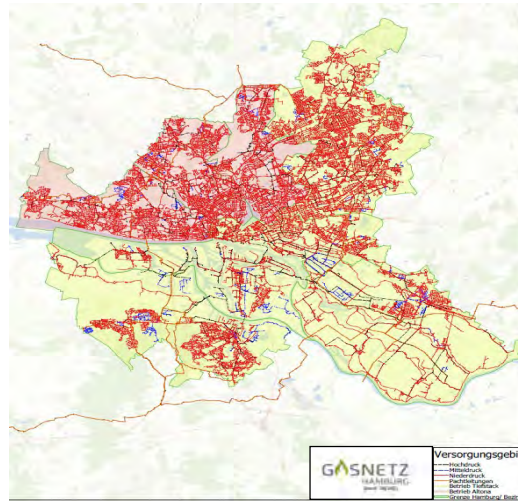

GASNETZ
FERNWÄRME



STROMNETZ
WASSER

DATEN

DATEN! DATEN! DATEN!

WER? Realisierungsträger


WO? Bereich

WAS? Art

WANN? Zeitraum


WIE? Verkehrsführung

→ ROADS

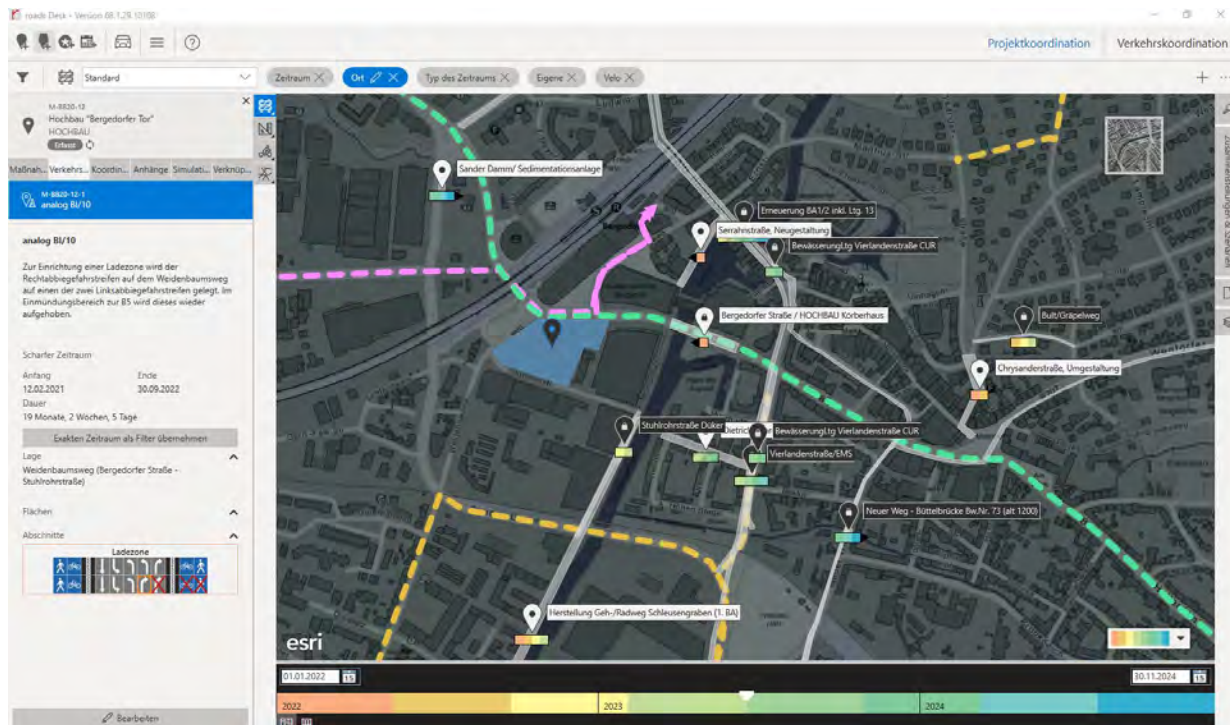


- Hauptverkehrsstraßen**
KOST (LSBG)
- Bundesautobahnen**
Autobahn GmbH
- BSGB**
(Bezirksstraßen mit gesamtstädtischer Bedeutung)
Bezirk

→ Dynamisches Koordinierungsnetz

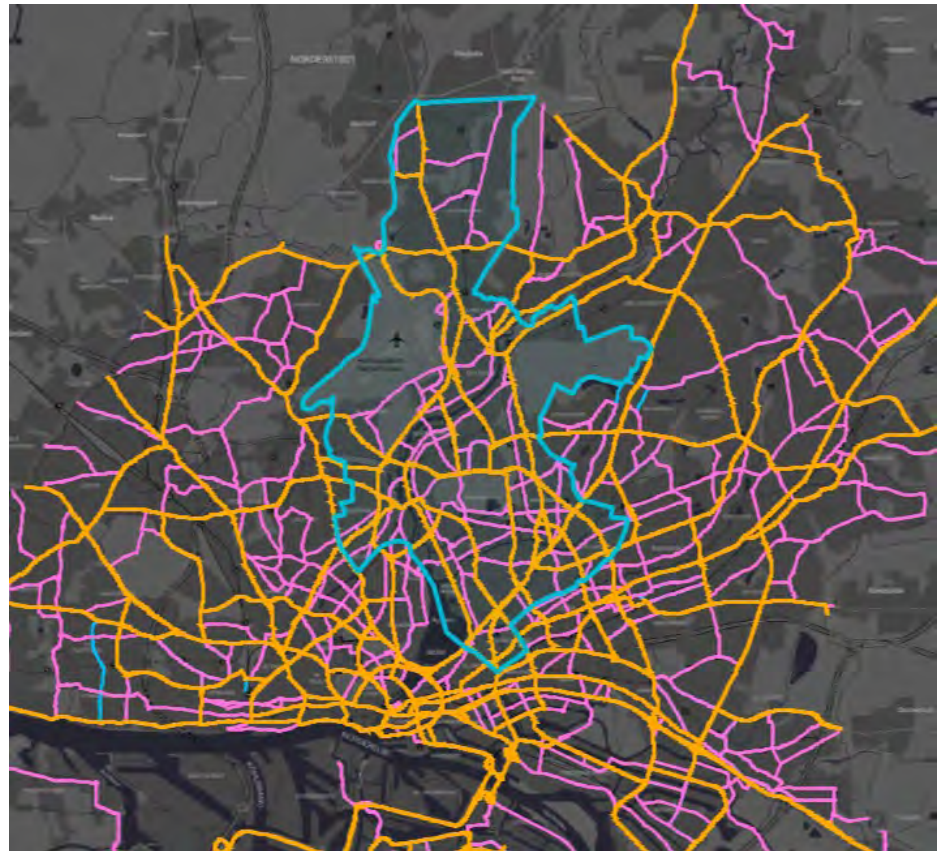

Herausgeber: FHH Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung
Kartengrundlage: Geobasiskarte

UMGANG MIT UMLIEGENDEN MAßNAHMEN

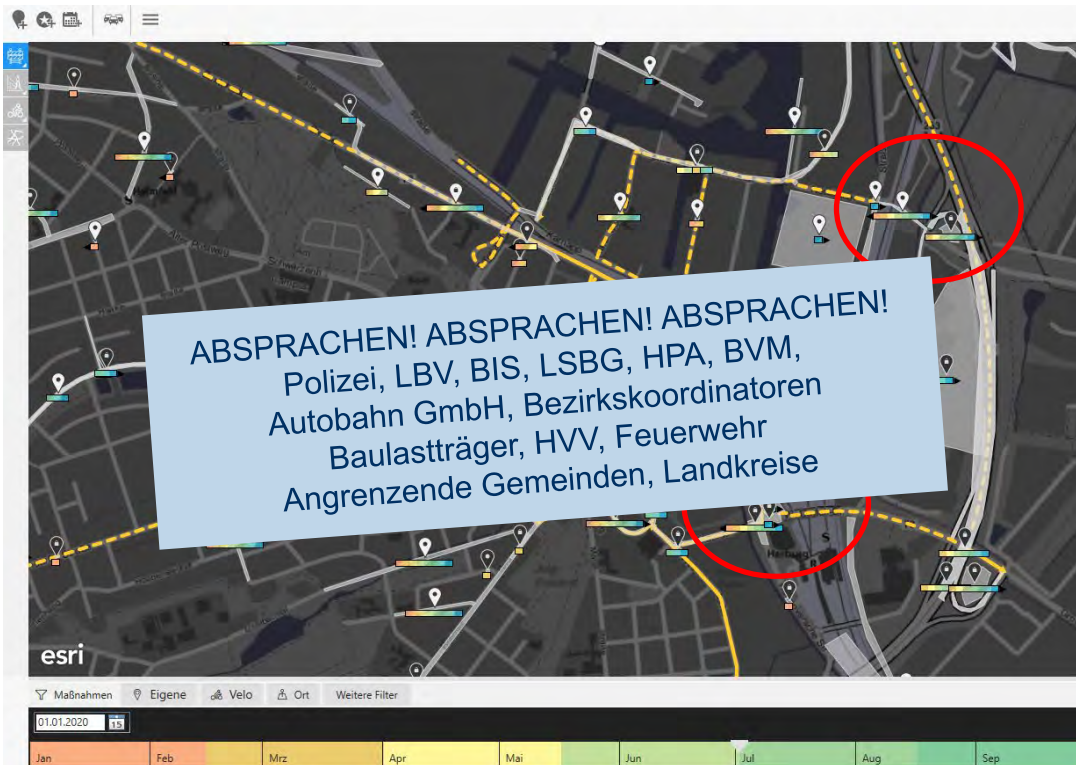

Baustellenkoordination Bergedorf

Bezirk/PK - anlassbezogen

Bezirk/Kost - 1x / Monat
 aktuelle verkehrsrelevante Maßnahmen

Verkehrsbesprechung - nach Bedarf
 Detailabstimmung


Bauprogrammkoordinierung - 2x / Monat
 Maßnahmen die in $\geq 1,5$ Jahren starten

Regionalkonferenz - 1x / Monat
 aktuelle Maßnahmen hamburgweit


Vorbereitung - 1x / Monat
 zur Steuerungsrunde

Steuerungsrunde - 1x / Monat
 Abstimmungen zu besonderen Maßnahmen

Länderkoordination - 2x / Jahr
 HH, NI und SH

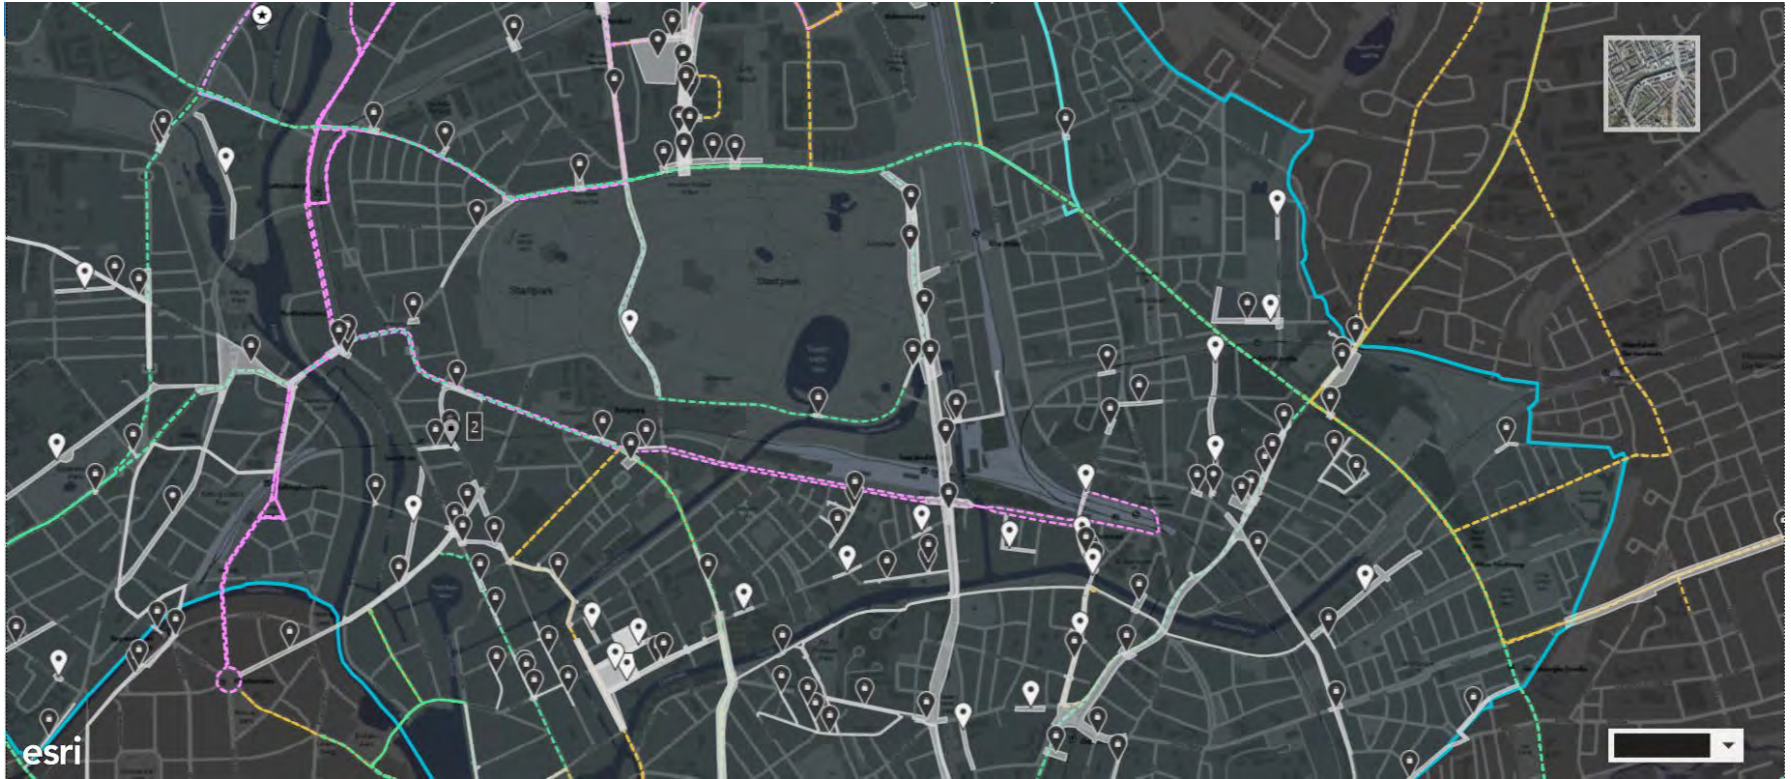

Jeder Punkt eine Maßnahme

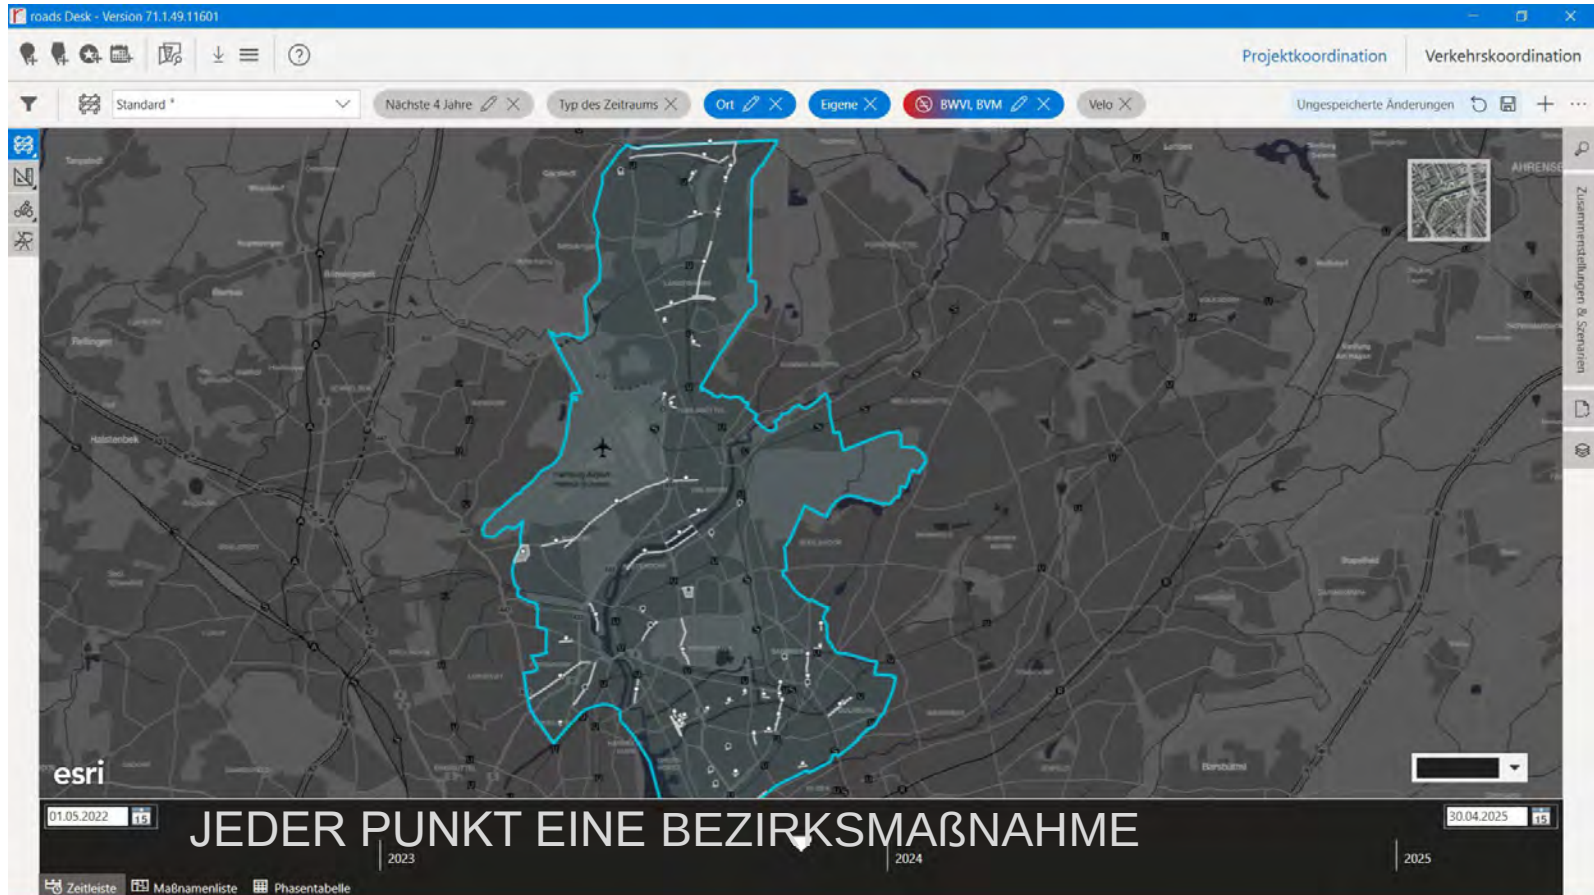

Kommunikation

- Steckbriefe
- Baustellenschild
- Anliegerinfo
- Pressemitteilung
- Homepage

Koordination

- Daten
- Absprachen
- umliegende Maßnahmen


Kooperation

- langfristige Planung
- Kooperation erkennen
- Maßnahmen zusammenlegen

Ausblick



Prozesshaus Projektkoordination und -kooperation

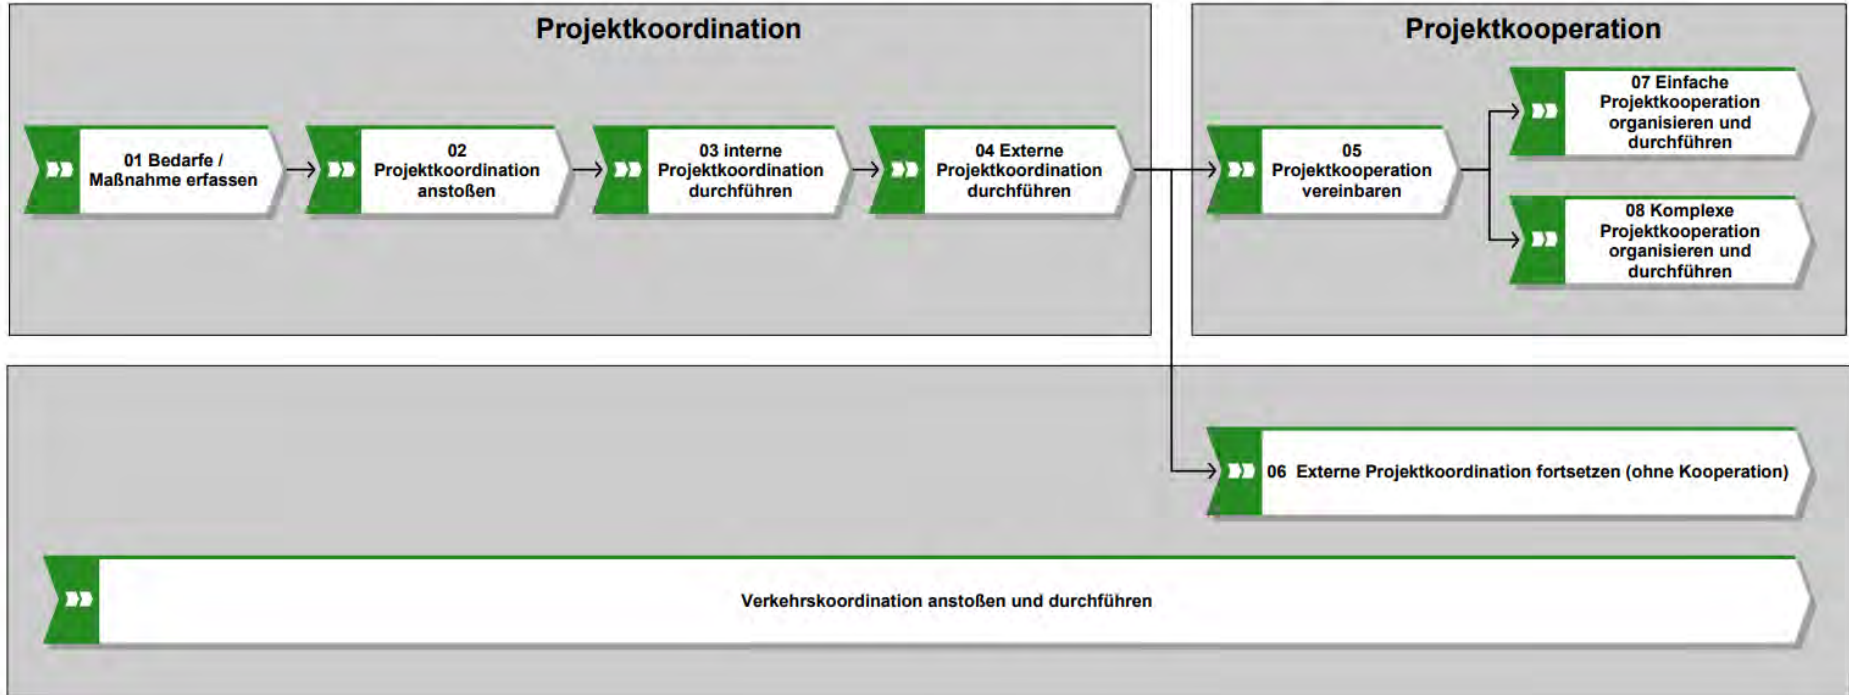

EINBINDUNG BEZIRKLICHER GREMIEN



Hamburg

Unser Angebot:

Übersicht verkehrsrelevanter* Maßnahmen

- Tabellarische Darstellung
- Maßnahmen des gesamten Straßennetzes im Bezirk
- Zeitraum: Bautätigkeit der kommenden 18 Monate
- Halbjährliche Einbringung in den Ausschuss per Drucksache
- Rückfragen schriftlich an die Geschäftsstelle der Bezirksversammlung

* Beispiele für Verkehrsrelevanz: Vollsperrung, Einbahnstraßenregelung, Fahrstreifensperrung

Tabellarische Darstellung

Titel Maßnahme	Lage auf	Lage von	Lage bis	Startdatum	Enddatum	Veranlasser
Baubedarf Winterhuderweg 38-40	Winterhuder Weg (38-40)			2022-01-01	2026-12-31	Hamburg Wasser
Schröderstraße / EMS	Schröderstraße	Ifflandstraße	Mühlendamm	2023-04-01	2023-09-30	Bezirk Hamburg-Nord
Überseering/New-York-Ring, U5Ost - Hst. City Nord	Überseering	Jahnring	Sydneystraße	2022-03-01	2027-12-31	Hamburger Hochbahn
Wallstraßenbrücke/ Erneuerung Fahrbahndecke	Wallstraßenbrücke	Wallstraße	Bürgerweide	2022-10-14	2022-10-16	LSBG
Alsterkrugchaussee / LSA 927 / ROKS	Alsterkrugchaussee	Etzestraße	Etzestraße	2023-01-01	2023-12-31	LSBG
Bramfelder Straße 79-83	Bramfelder Straße	Drosselstraße	Wachtelstraße	2022-01-01	2022-12-31	HOCHBAU
Hindenburgstraße	Hindenburgstraße	Bebelallee	Rathenaustraße	2024-03-01	2025-11-30	LSBG
Eppendorfer Baum / LSA 835 / ROKS	Eppendorfer Baum	Hegestraße	Hegestraße	2022-11-01	2023-02-28	LSBG
Steilshooper Straße, Hellbrookstraße bis Habichtstraße / Teilsanierung				2022-09-01	2022-11-30	Bezirk Hamburg-Nord
Neubergerweg/Hohe Liedt / VR4				2023-06-01	2024-04-30	Bezirk Hamburg-Nord
Salomon-Heine-Weg / EMS				2023-01-01	2023-06-30	Bezirk Hamburg-Nord
Tarpenbekstraße/Lokstedter Weg / Leitungsarbeiten	Lokstedter Weg / Tarpenbekstraße	Tarpenbekstraße 33	Lokstedter Weg 21	2022-01-29	2022-11-11	Hamburger Energiewerke GmbH
Uferwand Eilbekkanal Nord, 4. BA				2023-10-01	2025-06-01	LSBG
Hürthweg				2022-11-01	2023-03-31	Hamburg Wasser
VR13, Adolf-Schönfelder-Straße/ Wagnerstraße, Beim Alten Schützen	Adolf-Schönfelder-Straße/ Wagnerstraße	Beim Alten Schützenhof	Blumenau	2024-03-01	2025-11-30	LSBG
Alsterkrugchaussee / LSA 464 / ROKS	Alsterkrugchaussee	Hermann-Löns-Weg	Hermann-Löns-Weg	2023-01-01	2023-12-31	LSBG
Südring				2023-03-01	2023-06-01	Hamburg Wasser
Preystraße / EMS	Preystraße	Schinkelstraße	Forsmannstraße	2022-07-01	2022-10-31	Bezirk Hamburg-Nord
Hebebrandstraße 2 - Betr. Erschließung PERIGON	Hebebrandstraße	Limaweg	Rübenkamp	2023-06-01	2023-10-01	LSBG
Wendloher Weg / EMS	Wendloher Weg	Frickestraße	Lokstedter Weg	2023-04-01	2023-09-30	Bezirk Hamburg-Nord
Im Ring / EMI				2022-09-01	2022-12-31	Bezirk Hamburg-Nord
Weygandtstraße (Habit/Bleiprojekt)				2021-07-14	2022-12-31	Hamburg Wasser
Sechslingspforte / HOCHBAU Alsterschwimhalle	Sechslingspforte	Ifflandstraße	Ackermannstraße	2020-10-01	2023-12-31	HOCHBAU
Alsterkrugchausseetunnel / Instandsetzung	Zeppelinstraße	Weg beim Jäger	Sengelmanstraße	2022-10-07	2022-10-10	Autobahn GmbH
Barmbeker Str. / LSA 65 / ROKS	Barmbeker Straße	Maria-Louisen-Straße	Maria-Louisen-Straße	2022-11-01	2022-12-31	LSBG
Überseering/New-York-Ring, U5Ost - Vorbereitende Maßnahmen	Überseering	Jahnring	Sydneystraße	2022-03-01	2023-04-07	Hamburger Hochbahn
Watenau - Wandsbeker Ch. - Pappelallee Quatierssanierung Eilbek	Wartenau Wandsbeker Ch. Pappelallee	Blumenau	Landwehr	2022-03-10	2023-12-31	Stromnetz Hamburg
Saarlandstraße 1. Bauabschnitt Jahnring-U-Bahn Saarlandstraße	Saarlandstraße/Adolf-Schönfelder-Straße	Jahnring	Beim Alten Schützenhof	2023-01-01	2023-12-31	LSBG
Wartenau / LSA 240 / ROKS	Wartenau	Eilenau	Eilenau	2022-09-01	2022-10-31	LSBG
Langenhorner Chaussee / LSA 1889 / ROKS	Langenhorner Chaussee	U-Bahnhof Ochsenzoll	U-Bahnhof Ochsenzoll	2024-01-01	2024-12-31	LSBG

VIELEN DANK FÜR DIE AUFMERKSAMKEIT
